


SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: 19/09/2026 06:00 am - 20/09/2026 06:00 am

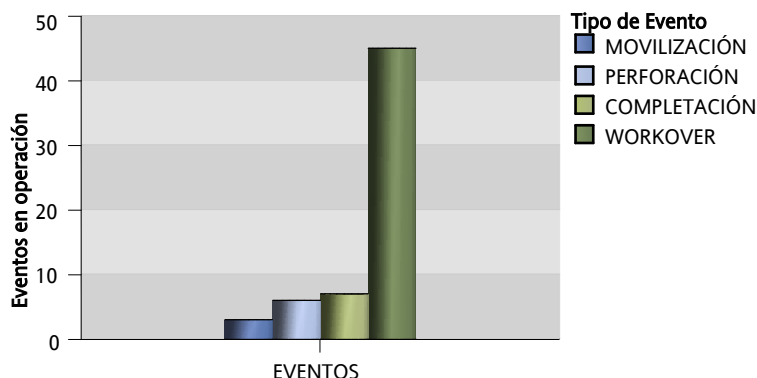

EN PERFORACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	MD	TVD	DETALLE
SINOPEC 220	NAPA-005	NAPO-A005	6.830	6.101,69	INSTALA SECCIÓN "A Y B" DEL CABEZAL MULTIBOWL. ARMA CONJUNTO BOP Y REALIZA PRUEBAS DE PRESIÓN. ARMA BHA #3 DIRECCIONAL CON BROCA PDC 12-1/4". BAJA EN PARADAS DE 5 1/2" DP HASTA 6787 FT. INICIA DRILL OUT.
SINOPEC 168	PCND-037I	PUCUNA-D037I	7.320	6.025,85	CIRCULA CON BHA #3 DD @6941 FT HASTA RETORNOS LIMPIOS. CONT. PERFORANDO SECCIÓN BHA #2 DD (BROCA PDC 16" + MOTOR) DESDE 6941 FT HASTA 7320 FT (PTO. CSG 13-3/8"). BOMBEA PÍLDORAS Y CIRCULA HASTA RETORNOS LIMPIOS. SACA BHA #3 DD HASTA SUPERFICIE Y DESARMA. RIG UP DE HRRTS DE CORRIDA DE CASING 13-3/8".
SLR-402	SHST-241	SHUSHUFINDI-T241	10.800	9.070,34	LEVANTÓ, ARMÓ Y BAJÓ BHA# 5 DIRECCIONAL CON BROCA PDC Y MOTOR DE FONDO HASTA TOPE DE TAPONES. REALIZÓ DRILL OUT DE EQUIPO DE FLOTACIÓN, PERFORÓ 10' DE NUEVA FORMACIÓN. REALIZÓ CAMBIO DE FLUIDO POR KLASHIELD DE 9.3 ppg. PRUEBA FIT. CONTINUÓ PERFORANDO SECCIÓN DE 8 1/2" CON BHA# 5 DIRECCIONAL CON BROCA PDC Y MOTOR DE FONDO.
SINOPEC 907	YRCH-037	YURALPA CENTRO-H037	7.550	7.550	ARMÓ Y BAJÓ BHA No 01 PRUEBA DE VÁLVULA MULTI-CICLOS, MÁS ARMÓ Y BAJÓ BHA No 02 MOLEDOR MÁS WHIPSTOCK CON FAST TRACK TRI-MILL DE 8-1/2"
SINOPEC 127	LOBC-013H	LOBO-C013H	11.553	9.934,34	PERFORA SECCIÓN DE 8-1/2" BHA#07 (PD675 ARCHER Y BROCA PDC 8-1/2") DESDE 10875 FT HASTA 11553 FT
SINOPEC 219	SCHAS-514	SACHA-AS514	1.760	1.756,26	CONTINÚA CORTE DE CSG DE 20". INSTALA CONDUCTOR Y FLOW LINE. ARMA Y BAJA BHA #02 DIRECCIONAL (BROCA PDC 16" + PD) HASTA 432 FT (TOC). REALIZA DRILL OUT HASTA 444 FT. PERFORA SECCIÓN DE 16" CON BHA #2 DIRECCIONAL DESDE 444 FT HASTA 1760 FT. CORRE GYRO A 713 FT, 1000 FT, 1380 FT Y 1760 FT.

EN COMPLETACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
CCDC-077	DRRA-054	DRAGO NORTE A-054	COM	BAJA BHA #02 DE LIMPIEZA EN TÁNDEM PARA LINER 7" Y CASING 9-5/8" HASTA 10184 FT, BOMBEA PÍLDORAS DE LIMPIEZA. CIRCULA, PRUEBA HERMETICIDAD DE LINER 7". SACA BHA #02 DE LIMPIEZA EN TÁNDEM HASTA SUPERFICIE Y QUIEBRA. CAMBIA NIPLE.
GEOPETSA-04	PCNC-047	PUCUNA-C047	COM	CONT. BAJANDO ENSAMBLAJE CON EQUIPO BES, EN 3 1/2" TBG, CBS3, 9.2#, L-80, DESDE 4,300' HASTA 8,730' MD, SUBIENDO TUBO A TUBO DESDE CABALLETES, LLENANDO TUBERIA, PROBANDO HERMETICIDAD

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: 19/09/2026 06:00 am - 20/09/2026 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
				DE TUBERIA CONTRA STD. VALVE, C/ 2000 PIES, CON 3000 PSI Y TOMANDO MEDIDAS ELECTRICAS C/ 2000 PIES, CON 275 JTS. DE 3 1/2" TBG DENTRO DE POZO — REALIZA EMPALME DE CABLE ELECTRICO DE CARRETO #1 A CARRETO #2 @ 5,564' MD
HILONG 28	PCNA-027	PUCUNA-A027	COM	TECNICOS HALL-HCT & FYT ASIENTAN RBP PACKER 7" A 9,740 FT + LIBERA SETTING TOOL HYD + ESPOTEA 3 BLS PILDORA VISCOSA SOBRE RBP PACKER +SACA SETTING TOOL HYD EN 3 1/2" DRILL PIPE DS-38 EN PARADAS A LA TORRE DESDE 9,740 FT HASTA 12 FT + QUIEBRA SETTING TOOL + HALL-WP DISPARA ARENISCA "U" 9,625 FT -9,635 FT (10 FT) & 9,581 FT -9,587 FT (6 FT) + CAMBIA NIPLE DE DISPAROS POR NIPLE CAMPANA + ARMANDO BHA #4 CON CHAMP PACKER IV.
ORD-907	SCY-057	SECOYA-057	COM	BAJAN BHA # 03 DE EVALUACIÓN, ASIENTAN RBP A 9968 FT, ASIENTAN PACKER HD A 9810 FT, INSTALAN STD. VALVE CON MEMORIAS, PRUEBAN ASENTAMIENTO CON PRESIÓN SIN ÉXITO, SE REALIZARON MÚLTIPLES PRUEBAS DE ASENTAMIENTO Y HERMETICIDAD SIN ÉXITO. BAJAN PULLING TOOL PARA RECUPERAR STD. VALVE CON MEMORIAS.
SINOPEC 129	SCHAO-613	SACHA-AO613	COM	BAJA EQUIPO BES CIA. BAKER DESDE 4600' HASTA 4873' + REALIZA EMPALME DEL PRIMER AL SEGUNDO CARRETO + MEGA CABLE + BAJA EQUIPO BES FLEX17.5 DESDE 4873' HASTA 10000'.
SINOPEC 932	JVNC-025	JIVINO-C025	COM	CONTINUA BAJANDO BHA # 3 HASTA 9975 FT + REALIZA CORRELACION DE MARCA RADIOACTIVA + DEJA CA;ONES EN PROFUNDIDAD + REALIZA CA;ONEO DE INTERVALO DE ARENISCA HOLLIN PRINCIPAL Y HOLLIN SECUNDARIO + OBSERVA SOPLO MODERADO + DESASIENTA PACKER + ECUALIZA COLUMNA HIDROASTATICAS + SACA BHA # 3 CONJUNTO TCP EN PARADAS A LA TORRE. FUERA DEL POZO 1870 FT.
SLR-401	ACAL-256H	AUCA-L256H	COM	BAJO EQUIPO ELECTRO-SUMERGIBLE. RCXLF 400, DENTRO DEL POZO 6000 FT, MEGO CABLE, CAMBIO CARRETE, REALIZO EMPALME, MEGO CABLE, BAJO EQUIPO ELECTRO-SUMERGIBLE. RCXLF 400, DENTRO DEL POZO 9289 FT, INSTALO XO 3-1/2" TSH-B PIN X 4-1/2" TSH-B BOX, REALIZO PRUEBA DE PRESIÓN CON 2000 PSI OK, BAJANDO EQUIPO ELECTRO-SUMERGIBLE. RCXLF 400, DENTRO DEL POZO 9600 FT

EN MOVILIZACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
CCDC-028	APKA-024	APAICA-A024	MOV	RDS + PREPARA EQUIPO PARA SKIDDING + REALIZA SKIDDING 36 METROS DESDE EL POZO APKA-023 AL POZO APKA-020 + DESARMA EQUIPO; RIG DOWN: 2%, RIG MOVE: 1%, RIG UP: 0%
CCDC-069	TTW-001	TETETE OESTE-001	MOV	PERSONAL DE CEMENTACION, DESARMA EQUIPOS, SIN TERMINAR + PERSONAL DE CIA. SERFORTET REALIZA INSPECCIONES A COMPONENTES DEL EQUIPO, SIN TERMINAR. DESARMA LINEA DE AGUA, SIN TERMINAR CONT. REALIZANDO LIMPIEZA DE LA TORRE Y REALIZA TRASVASE DE COMBUSTIBLE DEL TANQUE 2 Y 3 AL TANQUE 1
SINOPEC 907	YRCH-037	YURALPA CENTRO-H037	MOV	REALIZÓ PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO REALIZÓ PRUEBAS DINÁMICAS DEL RIG SINOPEC 907

EN WORKOVER

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
BRASERV-101	ACAQ-173	AUCA-Q173	05	BAJA EQUIPO BES DN1750S EN SENCILLOS DE TBG 3 1/2" TSH-BLUE ACTUAL DENTRO DEL POZO 7000 FT. REALIZAN CAMBIO DE CARRETO EN EL SPOOLER DEL #2 AL #3. ATL-SLB REALIZAN EMPALME DEL CABLE DE POTENCIA. COINTINÚA BAJANDO EQUIPO BES DN1750S EN SENCILLOS

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: 19/09/2026 06:00 am - 20/09/2026 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
				DE TBG 3-1/2" TSH-BLUE. INSTALA TUBING HANGER Y PRUEBA HERMETICIDAD CON 2000 PSI POR 15 MINUTOS. INSTALA CONECTOR ELÉCTRICO EN TUBING HANGER Y MULTIPACK. ASIENTA TUBING HANGER EN SECCIÓN B DEL CABEZAL, PROFUNDIDAD DE INTAKE 10200.6 FT. BAJA LLAVE HIDRÁULICA DE CIA MISSION PETROLEUM.
CCDC-052	GNTC-024	GUANTA-C024	09	SACÓ BHA DE CEMENTACIÓN Y DESARMÓ EN SUPERFICIE, ARMÓ BHA DE MOLIENDA Y BAJÓ HASTA 10346 PIES, MOLIÓ CEMENTO DURO Y MOLIENDO RETENEDOR.
DRILLCOTEC-020	EDYD-066	EDEN YUTURI-D066	05	BAJA BHA # 01 MOLEDOR HASTA 7703 FT. MUELE CHATARRA Y 7" TAPÓN CIBP DESDE 7703 FT HASTA 7726 FT. CIRCULA. SACA BHA # 01.
DYGOIL-30	PKSA-008	PAKA SUR-A008	06	REUNIÓN DE SEGURIDAD. MOVILIZACIÓN Y ARMADO DE EQUIPOS Y CAMPAMENTO. INICIA OPERACIONES. ARMA LÍNEAS. DESPRESURIZA POZO. LLENA TANQUES DE AGUA FRESCA. DESARMA CABEZAL. ARMA CONJUNTO BOP. RETIRA TBG HANGER. BAJA BLOQUE IMPRESOR.
HILONG 18	OSOA-150	OSO-A150	03	DESARMA CONJUNTO BOP. INSTALA SECCION "C" DEL CABEZAL Y CONECTOR ELECTRICO QUICKCONNECTOR. INSTALA BAYONETA Y CAPILARES DE INYECCION DE QUIMICA. PERSONAL PEC Y WAYRA REALIZA PUNCH LIST. ARRANCA EQUIPO BES 400PMXSSD FLEX7ER Y REALIZA PRUEBA DE GIRO HACIA EL TANQUE EL RIG. ALINEA POZO Y DIRECCIONA HACIA LA ESTACION. INICIA PRUEBA DE PRODUCCION. PREPARA Y BAJA TORRE DEL RIG. FINALIZA OPERACIONES EN EL POZO OSOA-150 WO#03 EL DIA SABADO 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 A LAS 18:00 HORAS. DESARMA EQUIPOS DEL RIG Y PREPARA CARGAS PARA MOVILIZACION. ESPERANDO LUZ DEL DIA.
INDEPENDENCE 126	OSOH-116	OSO-H116	02	BAJÓ BHA No 17 DE PESCA CON OVERSHOT DE 5-3/4" MAS MARTILLO DE 4-3/4" HASTA TOF REALIZÓ MANIOBRA DE ENGANCHE MAS TRABAJÓ LA SARTA CON TENSION MÁS SACA A SUPERFICIE BHA No 17 DE PESCA CON OVERSHOT DE 5-3/4" MAS MARTILLO DE 4-3/4" MÁS ARMAN BHA No 18 DE LIMPIEZA CON ROTARY SHOE Y WASH PIPE
OCIPAG 01	CYBC-060	CUYABENO-C060	07	CONTINUA SACANDO EQUIPO BES FLEX7ER DE CAI. BAKER EN TBG 3 1/2" EUE QUEBRANDO + DESARMA. S/L BAJA BLOQUE IMPRESOR 5 3/4". BAJANDO CAMPANA 5 1/2" X 3 1/2" EN DP 3 1/2" IF SUBIENDO TUBO A TUBO. A LAS 06H00 DENTRO DEL POZO 450'.
ORD-902	TVCB-002	TIVACUNO-B002	13	Continúa bajando BHA#1 flush joint de calibración en tubería DP 3-1/2" NC38 midiendo y calibrando desde 5,684.02 ft MD hasta 8,326.12 ft MD Bombea 200 gal de píldora lubricante; desplaza a fondo con 62 bls de agua de matado 8.4 ppg @ 3PBM con 100 PSI. Cuelga bloque en el mástil. Desliza y corta 90 ft de cable de perforación 1-1/8"; Saca fuera del pozo BHA#1 flush joint de calibración en paradas de DP 3-1/2" NC38 al encuelladero desde 7,995 ft MD hasta 793.86 ft MD.
ORD-903	OSOB-066	OSO-B066	05	MOVILIZA RIG ORD 903 DESDE GCLH 021_WO 01 HASTA OSOB 066_WO 05, DISTANCIA 71.6 KM. ARMA EQUIPO Y CAMPAMENTO EN POZO OSOB 066. INICIA OPERACIONES A LAS 03:00 HRS DEL 20-SEP-2026. ARMA LINEAS DE CONTROL DEL POZO. ALMACENA AGUA FRESCA EN TKS DEL RIG. PREPARA 500 BLS DE FLUIDO DE CONTROL ESPECIAL 8.4 LPG (SLB). DESGASIFICA POZO, OPR EN PROCESO.
ORD-904	PCN-006	PUCUNA-006	13	CONTINUA SACANDO BHA DE LIMPIEZA CON 6 1/8" JUNK MILL PIRANHA, EN TUBERÍA DE 2 7/8" DRILL PIPE IF S 135, 10,40 LBS/FT. QUEBRANDO TUBO A TUBO HACIA LOS CABALLETES, 'TECNICO DE CIA DYNADRILL DESARMA BHA DE LIMPIEZA, CAMBIA NIPLE DE FLUJO E INSTALA NIPLE DE DISPARO. CÍA. TRIPOINT REALIZA CORRIDA #01: SE BAJA HASTA 9493 FT. SE CORRELACIONA CON REGISTRO DE CEMENTO

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: 19/09/2026 06:00 am - 20/09/2026 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
				(HALLIBURTON) DESDE 9493 FT HASTA 9100 FT (393 FT) DELAY 12.4 FT. SE SACA A SUPERFICIE CANASTA (JUNK BASKET) CON ANILLO DE 5-3/4" SIN NOVEDADES. CORRIDA #02: BAJAN CAÑONES DE 3-3/8" (CAÑON 11 FT + CAÑON 11 FT) CARGADO CON 20 FT DE GAS GUN CON PROPELENTE + HERRAMIENTA DE CORRELACION 3-1/8" CCL HASTA 9414 FT, DISPARAN GAS GUN CON 20 FT DE PROPELENTE @ 8 DPP. ESTIMULAN ARENA "U" INTERVALO 9395 FT - 9414 FT SACAN A SUPERFICIE HERRAMIENTAS 3-1/8" CCL + CAÑON 3-3/8" (OBSERVA CAÑÓN 100% DETONADO). TÉCNICOS DE CÍA. TRIPPOINT ARMAN CAÑONES DE 3-3/8" (CAÑON 11 FT + CAÑON 11 FT) CARGADO CON 20 FT DE GAS GUN CON PROPELENTE + HERRAMIENTA DE CORRELACION 3-1/8" CCL. CORRIDA #03: BAJAN CAÑONES DE 3-3/8" (CAÑON 11 FT + CAÑON 11 FT) CARGADO CON 20 FT DE GAS GUN CON PROPELENTE + HERRAMIENTA DE CORRELACION 3-1/8" CCL..
ORD-906	SCH-118	SACHA-118	16	FINALIZAN SACADA EQUIPO BES MODELO WD3000 DE CÍA. ALKHORAYEF EN 3-1/2" EUE TUBING, 9,3 LB/FT L-80, EN PARADAS, MIDIENDO DESDE 4,570 FT HASTA 234,68 FT. MD BOTTOM (293 JUNTAS), DESARMAN BHA DE PRODUCCION Y EQUIPO BES. ARMAN BHA # 1 DE ESTIMULACION CON RETRIEVALMATIC PACKER. BAJAN BHA # 1 EN 3 1/2" EUE TUBERIA HASTA 4380 FT
PETROELF 6357	SCHL-172	SACHA-L172	09	REALIZAN REUNIÓN DE SEGURIDAD, ARMAN EQUIPO BES RC700 DE CIA CPTDC, SUBEN Y SUSPENDEN (2) POLEAS EN LA TORRE, CONECTAN 98 FT MLE, CONECTAN CAPILARES DE 3/8" Y 1/4", ARMAN BHA DE CIRCULACIÓN, BAJAN EQUIPO BES CON (3) BOMBAS RC700 DE CIA. CPTDC EN PARADAS DE TUBING SEAMLESS, 3-1/2in, 9.3ppf, L80-1, EUE, R2, API 5CT (REUTILIZADA) DESDE 190.52 FT HASTA 2956.8 FT, CAMBIAN CARRETO VACÍO POR CARRETO LLENO CON 2420 FT DE CABLE, EMPATAN CABLE #2 DEL 1er AL 2do REEL A 2956.86 FT, BAJAN EQUIPO BES CON (3) BOMBAS RC700 DE CIA. CPTDC EN PARADAS DE TUBING SEAMLESS, 3-1/2in, 9.3ppf, L80-1, EUE, R2, API 5CT (REUTILIZADA) HASTA 3900 FT
SINOPEC 933	ACAC-127	AUCA-C127	04	LEVANTÓ Y ARMÓ ENSAMBLE #03 (PACKER INFERIOR). REALIZÓ 2 EMPALMES HDMC + 1 EMPALME EDMC – R. REALIZÓ PRUEBA DE INTEGRIDAD DE PRESIÓN A LAS LÍNEAS DE CONTROL HIDRÁULICO DESPUÉS DE REALIZAR LOS EMPALMES. REALIZÓ EL CICLEADO DE LA VÁLVULA FCV – 1. INSTALÓ PIP TAG EN EL COUPLING DE JUNTA 3-1/2" TSH BLUE. INSTALÓ ENSAMBLE #04 (FCV SUPERIOR). REALIZÓ 2 EA EMPALMES HIDRÁULICOS OPEN 2 Y REALIZÓ PRUEBA A HDMC CON 10,000 PSI OK. REALIZÓ PRUEBA DE INTEGRIDAD DE LÍNEAS HIDRÁULICAS CON 2500 PSI PARA COMMON CLOSE Y CON 2000 PSI PARA OPEN 2. REALIZÓ CICLEADO DE FCV INFERIOR Y SUPERIOR, POSICIÓN FINAL FULL OPEN. INSTALÓ ENSAMBLE #05 (SGM).
SINOPEC 976	ACAK-248H	AUCA-K248H	01	BAJANDO EQUIPO BES S4000N EN TUBERÍA 3-1/2" EU, PROFUNDIDAD ACTUAL 6000 FT. REALIZAN CAMBIO DE CARRETO EN EL SPOOLER. TÉCNICOS DE ATL-SLB REALIZAN EMPALME DEL CABLE DE POTENCIA
SINOPEC-903	AGRA-035	AGUARICO-A035	02	BAJA BHA #10 LAVADOR CON 5 1/2" ROTARY SHOE EN 3-1/2" IF DRILL PIPE EN PARADAS HASTA 9966 FT, BAJA ROTANDO Y Y CIRCULANDO HASTA 9969 FT (3 FT DE AVANCE), OBSERVA INCREMENTO DE TORQUE, SIN AVANCE. CIRCULA CSG-TBG. SACA BHA#10 HASTA SUPERFICIE, 5 1/2" ROTARY SHOE SALE 100% DESGASTADA Y CON MARCAS DE INGRESO DE PESCAO. S/LINE BAJA 2 3/4" BLOQUE IMPRESOR HASTA 9975 FT, SALE CON CON MARCA SEMICIRCULAR DE POSIBLE HOUSING DEL EQUIPO BES. BAJANDO BHA #11 DE PESCA CON 5-9/16" OVERSHOT EN TUBERIA 3-1/2" IF DRILL PIPE EN PARADAS, 6526 FT DENTRO DEL POZO
SINOPEC-904	SHS-091	SHUSHUFINDI-091	26	S/LINE BAJA 5 3/4" BLOQUE IMPRESOR HASTA 77 FT, SALE CON MARCA

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: 19/09/2026 06:00 am - 20/09/2026 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
				DE COUPLING DE TUBERÍA 2-7/8" TSHB. TÉCNICO SERTECPET ARMA Y BAJA OVERSHOT HASTA 77 FT, MANIOBRA Y ENGANCHAS PESCADAS (TUBERÍA 2 7/8" TSHB), TENSIONA PROGRESIVAMENTE DESDE 80 KLBS HASTA 120 KLBS.(40 KLBS OVERPULL), PESCADAS LIBERAS Y LEVANTA SARTAS HASTA LA MESA. QUIEBRA OVERSHOT, ASEGURA PESCADAS EN CUÑA. SACANDO EQUIPO BES DN1750 CÍA SLB QUEBRANDO TUBERÍA 2-7/8" TSH BLUE, 4500 FT FUERA DEL POZO
SINOPEC-905	AGRA-021	AGUARICO-A021	07	SACÓ BHA DE CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA CON 6" TAPER MILL EN 3-1/2" NC38 DRILL PIPE TUBO A TUBO. DESARMÓ BHA DE CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA CON 6" TAPER MIL. REALIZÓ TOMA DE NIVEL CON ECHOMETER. CAMBIÓ NIPLE DE FLUJO POR NIPLE DE DISPAROS. REALIZÓ RIG UP DE UNIDAD SLB-WL, ARMÓ HERRAMIENTAS GR-CCL Y 7" CIBP.
TITAN-125	GNTG-030	GUANTA-G030	04	MOLIENDAO DE LOS HOMBROS DEL PACKER DESDE 9823 FT HASTA 9825 FT. TOTAL, DE AVANCE EFECTIVO: 2 FT + BOMBEA PÍLDORA VISCOSA DESPLAZA CON FLUIDO CONTROL CONVENCIONAL HASTA OBTENER RETORNOS LIMPIOS EN SUPERFICIE + DESCONECTA KELLY SWIVEL Y CUALGA SOBRE LA TORRE + SACAR BHA# 10 LAVADOR DE 6 1/8 " ROTARY SHOE PIRANHA MILL DESDE 9825 FT HASTA SUPERFICIE + DESARMA DEL BHA #10 LAVADOR DE 6 1/8 " ROTARY SHOE
TRIBOILGAS-101	CYB-020	CUYABENO-020	09	TÉCNICO DE CÍA SLB CONTINÚA ARMANDO BHA #05 CON SEGUNDA SECCIÓN DE FONDO (QUANTUM PACKER SUPERIOR). UNIDAD S/L RECUPERA STV. TÉCNICO DE CÍA SLB CONTINÚA ARMANDO BHA #05 CON SEGUNDA SECCIÓN DE FONDO (QUANTUM PACKER SUPERIOR). BAJA BHA #05 CON SEGUNDA SECCIÓN DE FONDO (QUANTUM PACKER SUPERIOR) EN PARADAS DE TUBERÍA 4 1/2" EUE, HASTA 7504.54' (CENTRO DE GOMAS). REALIZA CAMBIO DE FLUIDO. TÉCNICO DE CÍA. SLB REALIZA ASENTAMIENTO DE QUANTUM PACKER SUPERIOR. SACA BHA #05 CON 7 IN X4 IN QUANTUM SERVICE TOOL TYPE III EN PARADAS DE TUBERÍA 4 1/2" EUE HASTA 1939'.
TRIBOILGAS-102	DRTA-014	DRAGO ESTE-A014	11	CÍA. BAKER HUGHES ANÁLISIS MINIFRAC Y PREPARACION DE RECURSOS. APROBACION EN PROCESO DE PROGRAMA DE FRACTURA POST-RESULTADOS DE MINIFRAC. PRE HIDRATACION DE GEL, CARGA DE ARENA EN TORNILLOS, QAQC FLUIDOS Y PREPARATIVOS PARA FRACTURAMIENTO HIDRAULICO EN SIMULTANEO CAPTACION DE AGUA EN FRAC TANKS. CON SET DE FRACTURA BAKER HUGHES, EQUIPO DE WO PRESURIZA ANULAR CON 800 PSI. INICIA BOMBEO PARA FRACTURAMIENTO POZO LLENA CON 10 BBLs. FINALIZA BOMBEO CON SET DE FRACTURAMIENTO BAKER HUGHES. SE REALIZO FRATURAMIENTO HIDRÁULICO A LA ARENA TS
TRIBOILGAS-103	DRRC-052	DRAGO NORTE-C052	04	LLENAN TANQUES DEL RIG CON 500 BLS AGUA LIMPIA CON VACUUMS. PREPARAN 500 BLS DE FLUIDO DE CONTROL CONVENCIONAL DE 8,7 PPG. CONTROLAN POZO CON FLUIDO DE CONTROL CONVENCIONAL DE 8,7 PPG CASING TUBING A TRAVEZ DE LA CAMISA DE CIRCULACIÓN A 9723 FT, TOTAL BOMBEADO 690 BLS. MONITOREAN EL POZO SE OBSERVA ESTÁTICO. DESARMAN CABEZAL DE PRODUCCIÓN. ARMAN CONJUNTO BOP 11" 5000 PSI. ARMAN SUB-ESTRUCTURA. SUBEN HERRAMIENTAS PARA MANIPULACIÓN DE TUBERÍA 3 1/2" EUE. ARMAN UNIDAD SPOOLER. LEVANTAN SARTA HASTA LA MESA ROTARIA CON 126 KLBS. RETIRAN 3"BPV, TUBING HANGER. SACANDO EQUIPO BES RC700 DE CIA CPTDC EN TUBING 3-1/2" EUE OD 9.3 LPP, L-80, QUEBRANDO TUBO A TUBO HACIA LOS RACKS
TRIBOILGAS-105	SCY-033B	SECOYA-033B	09	FORZA ÁCIDO EN ARENA "Ui" Y ESPERA 2 HRS DE REMOJO + REALIZA PRUEBA DE ADMISIÓN EN ARENA "Ui", OK + DESASIENTA PKR MECÁNICO + SACA Y QUIEBRA BHA #03 DE PRUEBA EN SUPERFICIE + RDS + ARMA BHA #04 CON RETENEDOR DE CEMENTO DE 7" Y BAJA EN PARADAS DE TUBERÍA 3-1/2" IF DRILL PIPE DESDE 9.31 FT HASTA 6500 FT

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: 19/09/2026 06:00 am - 20/09/2026 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
TRIBOILGAS-106	SCH-070	SACHA-070	14	FINALIZA EMPALME DE CABLE, BAJAN EQUIPO BES DE CIA. SLB (DN1750-D1050N) TAPPER EN TUBERÍA 3-1/2" HSM-2 EN PARADAS HASTA 9269,27 FT, INSTALAN CROSS OVER MÁS TUBING HANGER, PROBANDO HERMETICIDAD CON 3000 PSI OK.
TRIBOILGAS-107	EDYK-111	EDEN YUTURI-K111	04	DESARMA BHA #01 MOLEDOR CON JUNK MILL 6-1/8" OD. ARMA BHA #02 DE LIMPIEZA EN TÁNDEM PARA CASING DE 9-5/8" Y LINER DE 7". BAJA BHA DE LIMPIEZA EN TÁNDEM HASTA 7505 FT. CIRCULA POZO EN REVERSA FLUIDO DE CONTROL ESPECIAL PARA LIMPIEZA DE POZO. SACANDO BHA #02 DE LIMPIEZA EN TÁNDEM PARA LINER DE 7" Y CASING DE 9-5/8" DESDE 7505 FT HASTA 4050 FT.
TRIBOILGAS-201	JVNA-001	JIVINO-A001	13	ARMA UNIDAD DE SELLOS Y BAJA EN TUBERIA 5-1/2 BTC
TRIBOILGAS-202	SCHAM-543	SACHA-AM543	01	Desarman BHA#4 de acondicionamiento más arman Lower Completion + Scab Liner 7"x 4.00 Quantum packer, bajan completación con tubería de 3 1/2" if drill Pipe en paradas hasta +/- 10756ft, con unidad de Wire Line correlación con marca radio activa para asentar Pkrs.
TRIBOILGAS-203	SCH-167	SACHA-167	12	CONTINÚA EVALUANDO POZO ARENA HI ALINEADO AL TANQUE BOTA DEL RIG, CIERRA POZO POR RESTAURACIÓN DE PRESIÓN, DYGOIL SLICKLINE ARMA EQUIPOS BAJA ABRIR CAMISA DE CIRCULACIÓN.
TRIBOILGAS-204	SCHAC-355	SACHA-AC355	05	CONTINÚAN BAJANDO BHA #02 DE LAVADO Y PESCA CON 6 1/8" ROTARY SHOE PIRANHA MILL POOR BOY MÁS 5 1/2" VENTURI JET JUNK BASKET DE CÍA. DYNADRILL EN TUBERÍA 3 1/2" IF DP EN PARADAS DESDE 5280 FT HASTA 10480 FT. REALIZAN MANIOBRAS DE ENGANCHE DE PESCADES DESDE 10480 FT HASTA 10488 FT. SACAN BHA #02 LAVADOR Y PESCA EN 3 1/2" IF DP DESDE 10488 FT HASTA 222.45 FT
TRIBOILGAS-206	YNEA-028	YANAQUINCHA ESTE-A028	04	CON UNIDAD DE SLICK LINE ASIENTA STD VLV CON MEMORIAS Y REALIZA PRUEBA, OK + ABRE CAMISA DE CIRCULACION Y REALIZA PRUEBA, OK + REALIZA CAMBIO DE FLUIDO EN EL POZO + CON SLICK LINE BAJA BOMBA JET + BAJA PRIMERA Y SEGUNDA SECCION DE LA TORRE + ARMA MTU Y LINEAS + REALIZA PRUEBAS + SUSPENDE OPERACIONES DEL POZO YNEA-028 WO#04 + EVALUA ARENA UM SIN TORRE.
TUSCANY-104	SHHC-027	SHUSHUQUI-C027	05	BAJA BHA#1 MOLEDOR EN 3-1/2" DP TUBO A TUBO HASTA 9674 FT (COTD). CIRCULA Y SACA BHA A SUPERFICIE EN PARADAS DE DRILL PIPE. DESARMA BHA: RECUPERA 6 LBS DE SÓLIDOS EN CANASTA, ECONOMILL EN BUENAS CONDICIONES. ARMA BHA#2 DE LIMPIEZA PARA CASING 9-5/8" Y BAJA EN PARADAS DE DRILL PIPE 3-1/2", DENTRO DEL POZO 7147 FT.
TUSCANY-105	SHSB-151	SHUSHUFINDI-B151	12	DESARMA BHA#11 CON OVERSHOT Y RECUPERA 508 FT DE TUBERÍA 3-1/2" TSH BLUE (21 FT TUBO + 15 TUBOS COMPLETOS + 18 FT TUBO). SLICK LINE REALIZA UNA CORRIDA DE BLOQUE IMPRESOR (REGISTRA MARCA DE CAPILAR/CABLE). BAJA BHA#12 CON ARPÓN EN TUBERÍA 3-1/2" IF DRILL PIPE HASTA 910 FT Y RECUPERA 30 FT CABLE + 10 FT CAPILAR + 2 PROTECTORES. BAJA BHA#13 CON ARPÓN EN TUBERÍA 3-1/2" IF DRILL PIPE HASTA 915 FT Y RECUPERA 10 FT CABLE + 5 FT CAPILAR. BAJA BHA#14 CON ARPÓN EN TUBERÍA 3-1/2" IF DRILL PIPE HASTA 915 FT Y NO RECUPERA MATERIAL. SLICK LINE REALIZA 2 CORRIDAS DE BLOQUE IMPRESOR (REGISTRA MARCA DE CAPILAR/CABLE). BAJA BHA#15 CON CREW GRAB EN TUBERÍA 3-1/2" IF DRILL PIPE HASTA 915 FT Y RECUPERA 1 FT CAPILAR. SLICK LINE REALIZA CORRIDA DE BLOQUE IMPRESOR
TUSCANY-111	CLBC-045	CULEBRA-C045	02	CONTINUÓ DESARMANDO EL BHA #3 DE CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA EN TÁNDEM, RECUPERÓ 16 LBS DE LIMALLA EN EL MAGNETO DE 7". PERSONAL DEL RIG REALIZA CAMBIO DE NIPLE DE FLUJO POR NIPLE DE DISPAROS. REALIZA REUNIÓN DE SEGURIDAD, ARMA EQUIPO DE

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: 19/09/2026 06:00 am - 20/09/2026 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
				GYRODATA, REALIZA REGISTRO MICRODOGLEG. RECUPERA Sonda HASTA SUPERFICIE, DESARMA EQUIPO DE GYRO DATA. LOCALIZA NIVEL DE FLUIDO CON ECHOMETER A 36FT (POZO LLENO). ARMA UNIDAD DE REGISTROS ELÉCTRICOS DE WL.. REALIZA CORRELACIÓN PARA APERTURA DE INTERVALO DE HOLLÍN INF, A 10,630FT – 10,690FT (60FT) A 10DPP.
VICTORIA 01	SCH-050	SACHA-050	16	SACANDO BHA # 4 MOLEDOR EN PARADAS HACIA LA TORRE. DESARMA BHA MOLEDOR. ARMA BHA MOLEDOR # 5. BAJA BHA # 5 MOLEDOR CON JUNK MILL 6-1/8" EN 2-7/8" IF DRILL PIPE EN PARADAS DESDE LA TORRE. INSTALAN KELLY SWIVEL Y ROMPEN CIRCULACIÓN OK. MUELE 7" R/C DESDE 9.450 FT HASTA 9.452 FT (2FT). CONTINÚA MOLIENDO CEMENTO DESDE 9.452 FT HASTA 9.545 FT (93 FT). CIRCULA POZO EN REVERSA. DESCONECTA KELLY SWIVEL DE LA SARTA Y CUELGA EN LA TORRE.
VICTORIA 03	EDYL-012I	EDEN YUTURI-L012I	01	DESARMA BHA # 9 MOLEDOR + ARMA BHA # 10 LAVADOR CON ZAPATA DE 8-1/2" PESCA + BAJA BHA # 10 TUBO A TUBO + INSTALA KELLY SWIVEL + MOLIENDA DEL CIBP + RETIRA KELLY SWIVEL + SLICK LINE BAJA BARRAS DE 1-7/8" A 6457 FT TOPA CIBP + BAJA BHA # 10 HASTA 3905 FT + CIRCULA POZO EN REVERSA (CSG - TBG) EN CIRCUITO CERRADO NO SE OBSERVA INFLUJO, NI PERDIDA DE FLUIDO, OK.
VICTORIA 04	SCH-115	SACHA-115	08	CORTA CABLE DE PERFORACION, TRABAJA SARTA PARA LIBERAR PACKER MECANICO. CIA HALLIBURTON WIRELINE REALIZA REGISTRO DE PUNTO LIBRE Y TUBING PUNCH PREVIO A REALIZAR CORTE DE TUBERIA.
VICTORIA 05	SCHAD-607	SACHA-AD607	02	Sacan equipo BES NH940M en tubería 3-1/2in, en paradas desde 4980 ft hasta 183 ft. Desarman BHA de producción. Desarman equipo BES NH940M de Cia. Novomet, Standing valve y no-go con material apuntalante, medidas eléctricas ff: 13.8 / 12.4 / 5.3 ohm ft: 002 kohm eléctricamente con bajo aislamiento y faces desbalanceadas, se quedan 19 bandas dentro de pozo. Corren bloque impresor de 5 1/2in hasta 10680 ft, bloque sale con marcas de chatarra (bandas). Técnico de Cia. Baker chequea equipo BES FLEX 7ER, realiza empalme de cable MLE a carrito de cable #4 doble capilar. Técnico de Cia Baker continua ensamblaje de equipo BES FLEX 7ER, operación en proceso.
VICTORIA 06	SCHG-274	SACHA-G274	13	DESARMA CABEZAL. INSTALA BOP. DESASIENTA PACKERS. SACAN COMPLETACION DE BOMBEO HIDRAULICO CON (2) PACKER HIDRAULICOS FHL 7" Y FHL 7"; EN TUBING 3-1/2" EUE, 9.3 LBS/FT, L-80 EN PARADAS DESDE 10177.53 FT HASTA 3947,53 FT
ZHONG YOU HAI 12 (CPOE-12)	AMSA-009	AMISTAD-A009	01	SLICK LINE VERIFICA FONDO OPERATIVO A 4918 FT TRABAJA BARRAS BAJA HASTA 4921 FT SACA A SUPERFICIE CIA STP BAJA BHA#14 ROTANDO Y CIRCULANDO HASTA 5034 FT REPASA SACA HASTA 4982 FT SLICK LINE BAJA BLOQUE IMPRESOR DE 2" HASTA 4982 FT SACA SE OBSERVA MARCA REDONDEADA EN LOS FILOS TÉCNICO STP SACA BHA HASTA 4722 FT LIBRE BAJA SIN ROTACIÓN NI CIRCULACIÓN HASTA 4918 FT APOYA CON 10-15 KLB SACA BHA#14 LIBRE POR EL COLAPSO CONTINUA SACANDO A SUPERFICIE QUIEBRA BHA#14 ARMA Y BAJA BHA#15 CON MULE SHOES 3 1/2" EN TUBERIA DP 3 1/2" EN PARADAS HASTA 4986 FT TRABAJA SIN ÉXITO SACA Y QUIEBRA BHA#15 CON MULE SHOE SALE TAPADO CON ARENA Y CEMENTO. ARMA CONJUNTO TCP CAÑONES DE 7" OD CARGADO @ 12 DPP CON TC41 EXTRA II CAMISA PROPELENTE + SISTEMA DE CONTROL DE ARENA FILTREX 5-1/2" BTC, 17 LB/FT, 20,53 FT. (SHIELDPIPER)
	LMNH-034	LIMONCOCHA-H034	03	BAJAN EQUIPO ELECTROSUMERGIBLE D3550N CON Y-TOOL Y BAJAN EN TUBING SMLS, 3 1/2", 9.2 PPF, L80 1% Cr., MLT2 CONN, MIDEN Y CALIBRAN SENCILLOS EN CABALLETES, EMPALME DE CABLES CON SARTA A 6010 FT. PRUEBAN HERMETICIDAD CADA 2000 FT CON 2500 PSI, TOMAN DATOS DE SENSOR Y MEDIDAS ELÉCTRICAS DEL CABLE.

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: 19/09/2026 06:00 am - 20/09/2026 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
	PKNB-023	PAKA NORTE-B023	02	EVALUÓ ARENA UI CON MTU #01 (BLACK PETROLEUM) + BOMBA JET 3 1/2" 2.81" "E-8" (BLACK PETROLEUM), HACIA TANQUE BOTA (SIN TORRE).

* Pozos con eventos abierto

No hay datos disponibles
