


SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Feb/1/2021 06:00 am - Feb/2/2021 06:00 am

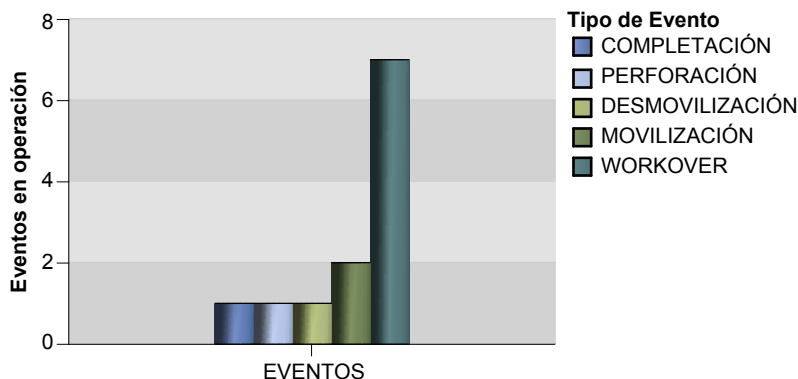

EN PERFORACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	MD	TVD	DETALLE
SINOPEC 219	CYBE-105	CUYABENO-E105	8,134	8,003.59	CONTINÚA BAJANDO BHA No. 07 DIRECCIONAL DE 8-1/2" DESDE 2800 FT HASTA EL FONDO A 7763 FT, PERFORA HASTA 8134 FT (TD), CIRCULA Y REALIZA VIAJE DE CALIBRACIÓN AL ZAPATO DE 9-5/8", REGRESA A FONDO, CIRCULA, ESPOTEA PÍLDORA. SACA BHA No. 07 A SUPERFICIE.

EN COMPLETACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
CCDC-069	PRHH-032	PARAHUACU-H032	COM	BAJANDO EL BHA#6 CON TCP HASTA PROFUNDIDAD DESEADA, U INF 11607 - 11631 FT (24 FT), A LAS 04:00 @ 11341 FT, A LAS 05:00 @ 11632.72 FT PROFUNDIDAD FINAL, INSTALANDO POLEAS, CORRELACIONANDO, ENVIANDO DATA, VALIDANDO, AUTORIZACIÓN PARA DETONAR CAÑONES.

EN DESMOVILIZACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
CCDC-036	TMBB-080H	TAMBOCOCHA-B080H	DMOV	- EMBARCA Y ENVÍA 6 CARGAS (- 5 CAMPER; - CAMION DE PLUSAMBIENTE) DESARMADO: 80%; MOVILIZADO: 70%

EN MOVILIZACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
RMS-402	SHSAC-230	SHUSHUFINDI-AC230	MOV	CONTINUÓ OPERACIONES DE ARMADO DEL EQUIPO RMS-402. MOVILIZADO 100%, ARMADO 95%.
SLR-401	ACAJ-133	AUCA-J133	MOV	CONTINUÓ OPERACIONES DE MOVILIZACIÓN Y ARMADO DEL EQUIPO SLR-401 EN LOCACIÓN AUCA 89.

EN WORKOVER

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
GEOPETSA-04	YLBD-022	YULEBRA-D022	03	DESARMA EQUIPO Y PREPARA CARGAS PREVIO A MOVILIZACION.
GEOPETSA-05	PCN-006	PUCUNA-006	10	INSTALA LANDING JOINT EN TBG HANGER, LEVANTA SARTA, CORTA Y MEGA CABLE BAJO EL HANGER, DESCONECTA TBG HANGER, SUBE + CUELGA POLEA EN LA TORRE, SACANDO EQUIPO BES ENCAPSULADO SF900 QUEBRANDO TUBERIA 3 1/2" EUE HACIA LOS CABALLETES,

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Feb/1/2021 06:00 am - Feb/2/2021 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
GEOPETSA-07	SHS-009	SHUSHUFINDI-009	14	SLK BAJA 1.9 PARAFFIN CUTTER PARA CALIBRAR TBG SIN ÉXITO, BAJA HASTA 5 FT. SLK BAJA 1.75 CALIBRADOR TBG SIN ÉXITO, BAJA HASTA 6 FT. DESPRESURIZA POZO A TRAVÉS DE POOR BOY Y MECHERO. RETIRA SECCIÓN C DEL CABEZAL. INSTALA ADAPTER ROSCABLE Y 11" X 5M PSI BOP
SINOPEC 932	EDYD-086	EDEN YUTURI-D086	04	RIG DOWN LLAVES DE TIW Y SPOOLER. SUBE LLAVES DEL RIG. ARMA KELLY SWIVEL. ARMA BHA DE RECUPERACIÓN DE BHA DE FONDO. BAJA DE RECUPERACIÓN DE COMPLETACIÓN DE FONDO. REALIZANDO MANIOBRA DE ENGANCHE
TRIBOILGAS-103	LMNB-059	LIMONCOCHA-B059	02	SACANDO BHA#4 DE PESCA EN DP 2-7/8 IF + DESARMA BHA #4 DE PESCA + ARMA BHA #5 DE MOLIENDA CON ZAPATA
TUSCANY 111	ACAF-136	AUCA-F136	03	BAJAN LIMPIANDO CON COILED TUBING, CONFIRMAN FONDO OPERATIVO, SUBEN @ 7000FT, ESPERAN POR DECANTACION, BAJAN CON CTU TOPAN @ 10888 FT, SACAN CTU, DESARMAN CABEZA INYECTORA Y MTU, ARMAN EQUIPO DE BOMBEO
TUSCANY-105	CNOE-014	CONONACO-E014	11	LEVANTA SARTA. SACA EQUIPO BES D460N CON TUBERÍA 3 1/2 EUE UNO A UNO HASTA 5060'. CAMBIA CARRETO EN SPOOLER. SACA EQUIPO BES D460N CON TUBERÍA 3 1/2 EUE UNO A UNO.

* Pozos con eventos abierto

No hay datos disponibles
