


SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Jan/31/2023 06:00 am - Feb/1/2023 06:00 am

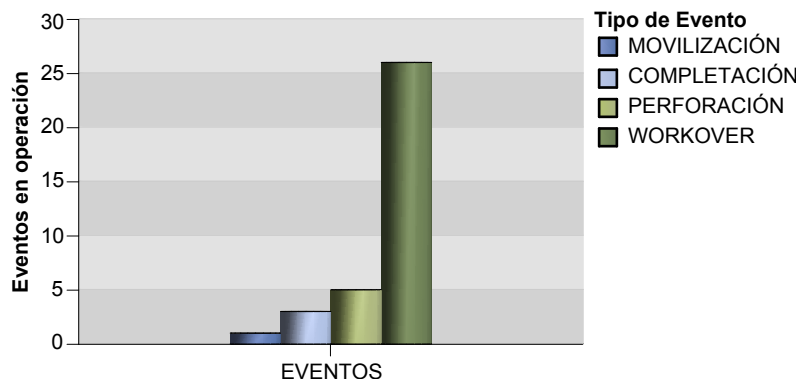

EN PERFORACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	MD	TVD	DETALLE
SINOPEC 183	CLBC-056	CULEBRA-C056	10,511	9,352.67	BAJÓ CASING DE 9 5/8", 53.5 lbs/pie P-110 TXP-BTC + 9 5/8", 53.5 lbs/pie, N-80Q TXP-BTC Y 9 5/8", 47 lbs/pie, N-80Q TXP-BTC HASTA 10,497 MD' + CIRCULO POZO ESTABILIZANDO PRESIONES + CEMENTA CASING DE 9 5/8" SEGÚN PROGRAMA
PETREX 5824	LGAJ-061H	LAGO AGRIO-J061	10,793.52	10,300.27	CONT. PERFORANDO SEC. DE 8-1/2" CON BHA DIR. (BHA #4) HASTA TD DE SECCION @ 9,790 ft MD + CIRCULO HOYO + SPOTEÓ PILD. LUBRICANTE SELLANTE + SACÓ BHA DIR. 8-1/2" HASTA VENTANA EN CSG DE 9-5/8" @ 7138 ft + CIRCULÓ HOYO + SACÓ Y DESARMÓ BHA DIR. DE 8-1/2"
CCDC-028	ISHB-047	ISHPINGO-B047	542	542	BAJA CASING DE 20"HASTA 314 FT + CIRCULA +CEMENTA CON STABIN DE 20" + ASIENTA CSG DE 20" + REALIZA CORTE + ARMA TUBO CONDUCTOR DE 20" CAMISA DE FLOW LINE + ARMA BHA # 2 CON BROCA PDC DE 16" + BAJA H/307 FT +DRILL OUT + PERFORAR SECCIÓN DE 16" H/542 FT
SLR-402	AGRA-016	AGUARICO-A016	5,600	5,259.69	PERFORÓ HOYO DE 16" CON BHA #2 DIRECCIONAL CON PD Y BROCA PDC DESDE 1600' HASTA 5600'
CCDC-066	ISHA-028	ISHPINGO-A028	2,767	2,688.57	ARMA EQUIPO DE FLOTACIÓN + BAJA CSG 13 3/8" HASTA 2767 FT + CIRCULA PARA ESTABILIZAR PARAMETROS Y CEMENTA CSG 13 3/8" SEGUN PROGRAMA + REALIZA TOP JOB + CORTA CSG E INSTALA SECCIÓN AB DE CABEZAL MULTIBOWL + ARMA Y PRUEBA BOP

EN COMPLETACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
SINOPEC 185	ISHB-062I	ISHPINGO-B062I	COM	SACA Y QUIEBRA BHA #02 DE LIMPIEZA EN 5 1/2 DP + CAMBIA NIPPLE DE FLUJO POR NIPPLE DE DISPAROS + ARMA Y BAJA HERRAMIENTAS DE REGISTROS H/ 8841' (LC) + REGISTROS DE CALIDAD DE CEMENTO + SACA Y QUIEBRA HERRAMIENTAS + DISPARA INTERVALO EN M1: 7326'-7346'
SINOPEC-903	SHSO-100	SHUSHUFINDI-O100	COM	CONTINÚAN FORZANDO PÍLDORA REMOVEDORA. TOMAN ECHOMETER, NIVEL 230 FT. DESARMAN Y RETIRAN EQUIPOS DE SLB-WL. CAMBIAN NIPLE DE DISPAROS POR NIPLE DE FLUJO Y CAMPANA. TOMAN ECHOMETER, NIVEL 236 FT. ARMA BHA #2 DE ESTIMULACIÓN.
SLR-401	ACAO-283	AUCA-O283	COM	BAJAN EQUIPO ELECTROSUMERGIBLE DN-1750 EN 3-1/2" TUBERIA EUE EN SENCILLOS HASTA 11,585 PIES

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Jan/31/2023 06:00 am - Feb/1/2023 06:00 am

EN MOVILIZACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
CCDC-036	TPTD-099H	TIPUTINI-D099H	MOV	CONTINUA MOVILIZANDO EQUIPO A TPTD, PREPARAN + ENVÍAN CARGAS DESDE TPTCP-098I HASTA POZO TPTD-100 + DESARMA LINEAS DE TANQUES DE LODO Y SISTEMA ACTIVO + DESCONECTA MANGUERAS HIDRAULICAS Y RETIRA GATOS DEL BOP (AVANCE RIG: RD: 95%, RM: 92%, RU: 47%)

EN WORKOVER

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
CCDC-040	SCHAC-351	SACHA-AC351	09	SLICK LINE DE CIA DYGOIL BAJA 5 3/4" BLOQUE IMPRESOR. CAMBIA RAMS DE 3 1/2" POR 2 7/8" . ARMA BHA DE PESCA CON 5 3/4" OVERSHOT. BAJA BHA DE PESCA EN 2 7/8" DRILL PIPE SUBIENDO TUBO A TUBO DESDE LOS CABALLETES HASTA 9930 FT.
CCDC-042	PLAC-013	PALO AZUL-C013	07	MOVILIZA EQUIPO DESDE PATA-002 HACIA PLAC-013. INICIA OPERACIONES A LAS 18H00 DEL 31 DE ENERO DEL 2023. WIRELINE BAJA Y REALIZA TUBING PUNCH. PREPARA FLUIDO DE CONTROL ESPECIAL. CONTROLA EL POZO POR REVERSA. INSTALA BPV, DESARMA CABEZAL.
CCDC-052	SHSH-201	SHUSHUFINDI-H201	05	BAJAN RECIPROCANDO BHA #12 DE LIMPIEZA 7" LINER HASTA 9875 FT COTD. SACAN BHA HASTA 9371 FT TOPE DE LINER. CORTAN CABLE DE MALACATE. ARMAN UNIDAD DE BOMBEO. BAJAN BHA HASTA 9867 FT. SLB BOMBEA PICKLING. CAMBIA FLUIDO AL POZO. BOMBEAN HCL 7.5 ACETIC 10% UI
DRILLCOTEC-020	CYBF-036	CUYABENO-F036	08	DESARMA CABEZAL+ ARMA BOP+ ARMA UNIDADES DE SPOOLER + CUELGAN POLEAS EN LATORRE + SACAN EQUIPO BES WD 1000 ALKHORAYEF.
DYGOIL-30	DRRB-037	DRAGO NORTE-B037	07	BAJA BHA #17 DE MOLIENDA CON 5-7/8" JUNK MILL EN 3-1/2" Y 2-7/8" IF DRILL PIPE HASTA 10147 FT + MUELE SOLIDOS CON 5-7/8" JUNK MILL DESDE 10147 FT HASTA 10277 FT (AVANCE: 130 FT) + MUELE CIBP'S A 10280 FT Y 10290 FT.
FASTDRILLING-11	VHRC-023	VICTOR HUGO RUALES-C023	07	INSTALA CONJUNTO BOP, RETIRA TUBING HANGER, SUBE POLEAS, SACA EQUIPO BES SF900 EN 3-1/2" TUBERÍA EUE EN PARADAS HASTA SUPERFICIE, DESARMA BHA DE CIRCULACIÓN, BAJA POLEAS, DESARMA EQUIPO BES SF900
ORD-902	SHS-054	SHUSHUFINDI-054	18	ARMA LLAVE HIDRAULICA, LEVANTA RETIRA TBG HANGER, SUBE POLEA SACA 2 7/8" TSH-BLUE, BAJA POLEA, BAJA BLOQUE IMPRESOR SUBE LLAVE DEL RIG ARMA Y BAJA BHA#1 DE PESCA, BAJA BLOQUE IMPRESOR ARMA Y BAJA BHA#2 DE PESCA BAJA BLOQUE IMPRESOR SUBE LLAVE HIDRAULICA
ORD-903	YCAE-040	YUCA-E040	03	INSTALA TUBO DE MANIOBRA Y LEVANTA HANGER 11"X 4 1/2" EUE BOX, UP-DOWN. POOH EQUIPO BES Y BHA DE PRODUCCIÓN
SINOPEC 932	ACAI-085	AUCA-I085	06	BAJA TORRE DEL RIG. LIBERACIÓN DE UNIDADES PARA MOVILIZACIÓN. REUNIÓN DE SEGURIDAD Y APERTURA DE PERMISO DE TRABAJO. MOVILIZANDO EQUIPOS DEL POZO ACAI-108 HASTA EL POZO ACAI-085.
SINOPEC-905	LMNH-033	LIMONCOCHA-H033	04	SACA BHA DE EVALUACION, DESARMA, SIMULACRO DE ARREMETIDA DE POZO
TRIBOILGAS-101	SCHAH-401	SACHA-AH401	04	BAJANDO CAMPANA ON-OFF DESDE 2500 FT, HASTA 9122.15 FT + SLICK LINE RECUPERA 2.75" STD VALVE + SACA TUBERIA Y 2 PUP JOINTS DESDE 10136.42 FT HASTA 9814.37 FT + ARMA EQUIPOS DE REGISTROS ELECTROMAGNETICOS + CONTINUA SACANDO CAMPANA ON-OFF HASTA 2722.49 FT.

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Jan/31/2023 06:00 am - Feb/1/2023 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
TRIBOILGAS-103	SCHAH-400	SACHA-AH400	03	EMPIEZA INYECCIÓN DE 79BLS DE TRATAMIENTO WATER CONFORMANCE BULLHEADING A LA ARENA "HI" PARA CONTROL DE PRODUCCIÓN DE AGUA + CONTINÚA FORZAMIENTO SIN EXCEDER PARÁMETROS.
TRIBOILGAS-104	PYMG-030	PAYAMINO-G030	05	REALIZA PAD MOVE DESDE PYMG 031, TOTAL 8 MTS. INICIA OPERACIONES @ LAS 14:00 HRS DEL 31-ENERO-2023. PREPARA 400 BLS DE FLUIDO DE CONTROL BASICO 8.34 LPG (HALL). CONTROLA POZO POR BACHEO, MONITOREA PRESIONES 0 PSI. DESARMA SECCION C.
TRIBOILGAS-106	EDYA-059	EDEN YUTURI-A059	06	BAJAN EQUIPO BES EN TUBERÍA 3-1/2" TSH BLUE. MEGAN CABLE. CAMBIAN DE CARRETO, REALIZAN EMPALME.
TRIBOILGAS-107	ISHA-011H	ISHPINGO-A011H	02	CONT. BAJANDO EQUIPO BES D4000NX HASTA 3028.13 FT. S/L RECUPERA 2.81" STD. VALVE @ 2843 FT.
TRIBOILGAS-201	PKSA-004	PAKA SUR-A004	04	SACANDO BHA DE DISPAROS CON TCP EN TUBERIA 3-1/2 EUE + SALE A SUPERFICIE Y DESARMA + ARMA COMPLETACION DE FONDO Y BHA DE EVALUACION
TRIBOILGAS-203	SCHAL-443	SACHA-AL443	07	CONT. SACANDO BHA #4 DE PESCA CON OVERSHOT DE 5-3/4" + PESCA EN PARADAS DE DP DE 4" XT39., DESARMAN BHA #4 DE PESCA + PESCA (BES 100% RECUPERADA), BAJAN BLOQUE IMPRESOR DE 5-1/2" HASTA 10326 FT (REGISTRA MARCAS DE CHATARRA), ARMAN BHA #5
TRIBOILGAS-204	SCHAB-315	SACHA-AB315	05	SACA BHA DE LIMPIEZA PARA CASING 7" EN 2 7/8" IF DP QUEBRANDO DESDE 10227' HASTA SUPERFICIE Y DESARMA BHA. QUIEBRA KELLY SWIVEL. CAMBIA NIPLE. WIRE LINE HALLIBURTON REALIZA REGISTRO DE EVALUACIÓN DE CEMENTO Y CORROSIÓN DESDE 10202' HASTA 9500'.
TUSCANY 104	SHH-012	SHUSHUQUI-012	08	SACA BHA MOLEDOR A SUPERFICIE (DESGASTE JUNK MILL 50%). ARMA BHA DE LIMPIEZA Y BAJA EN PARADAS DE DRILL PIPE 3-1/2", REPASANDO ZONAS DE INTERÉS HASTA 9157 FT. CAMBIA FLUIDO DE CONTROL. ESPOTEA ROMPEDOR. SACA BHA DE LIMPIEZA, FUERA DEL POZO 1780 FT.
TUSCANY 111	ACAH-160	AUCA-H160	05	INSTALO Y PROBO CONJUNTO DE PREVENTORES. LEVANTO SARTA TENSIONANDO CON 73 KLBS Y RETIRO TUBING HANGER. SACAO EQUIPO BES S8000 1.060 FT, CIRTO CABLE Y REPLAZO CARRETO EN EL SPOOLER.
TUSCANY-105	ACAL-137	AUCA-L137	01	ARMA BHA DE CALIBRACIÓN. BAJA BHA DE CALIBRACIÓN CON TUBERÍA 3 1/2" DP UNO A UNO HASTA 9900 FT. TOMA NIVEL DE FLUIDO CON ECHOMETER.
VICTORIA 01	ARMB-010	ARMADILLO-B010	03	PRUEBA DE BOP CON TEST PLUG, S/L BAJA BLOQUE IMPRESOR 5.62" HASTA TOPE DE LINER @ 9278 FT, ARMA KELLY SWIVEL EN LA TORRE, ARMA Y BAJA BHA DE LIMPIEZA EN TANDEM PARA CSG DE 7" Y 9 5/8"
	GNTA-020	GUANTA-A020	06	WERELINE ARMA EN SUPERFICIE LOS EQUIPOS DE WIRELINE Y REALIZA CORRIDA ,SE ARMA GAMMA GUN / CCL + SETTING TOOL + 7" CIBP, SE ASIENTA CIBP 7" 9800FT (OK). ARMAS + BAJAR BHA DE PRUEBA CON 9-5/8" X 3-1/2" EUE PACKER MECANICO RTM

* Pozos con eventos abierto

No hay datos disponibles
