


SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Mar/3/2026 06:00 am - Mar/4/2026 06:00 am

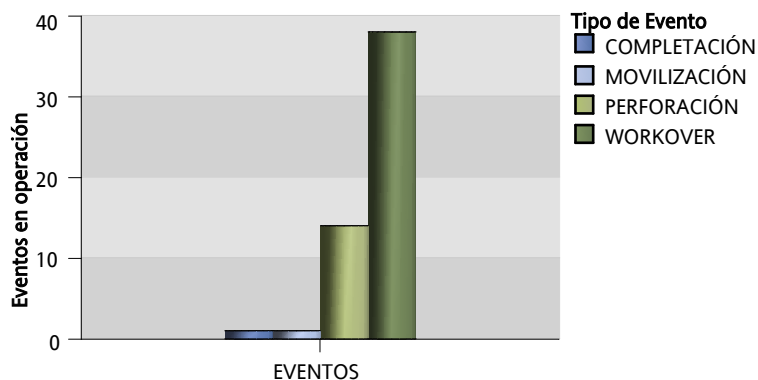

EN PERFORACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	MD	TVD	DETALLE
SINOPEC 219	SCHAS-510	SACHA-AS510	6,562	6,347.36	SACA BHA #2 DIRECCIONAL HASTA SUPERFICIE Y DESARMA. ARMAR EQUIPO DE CORRIDA CSG 13-3/8". BAJA CSG 13-3/8" EN HOYO ABIERTO 16" HASTA 6300 FT
SINOPEC 127	LOBC-008	LOBO-C008	2,100	2,093.39	PERFORA SECCIÓN DE 16" CON BHA# 03 DIRECCIONAL (MOTOR A962M Y BROCA PDC 16") DESDE 1009 FT HASTA 1849 FT. TOMA GYRO. CONTINÚA PERFORANDO CON BHA #03 DD DESDE 1849 HASTA 2100 FT.
SINOPEC 185	ACAR-279H	AUCA-R279H	9,336	8,347.65	CONTINUÓ PERFORANDO SECCIÓN DE 12 1/4" CON BHA# 3 DIRECCIONAL CON BROCA PDC BXZ516 Y PD ORBIT DESDE 8,330' HASTA 8,851'. PERFORÓ SECCIÓN DE 12 1/4" CON BHA# 3 DIRECCIONAL CONTROLANDO PARÁMETROS EN CONGLOMERADO INFERIOR
SLR-402	SHSB-236	SHUSHUFINDI-B236	6,884	5,862.09	BAJA CSG DE 13 3/8", 68/54.5#, K-55, BTC DE ACUERDO A PROGRAMA DE 262' HASTA 6720'.
SLR-401	ACAP-254I	AUCA-P254I	14,140	14,140	PERFORÓ SECCIÓN DE 8 1/2" CON BHA # 6 DIRECCIONAL CON PD ORBIT + BROCA PDC DE 8 1/2" DE 13,675' A 14,140' CIRCULÓ HASTA RETORNOS LIMPIOS. REALIZÓ VIAJE DE CALIBRACIÓN SOBRE TOPE DE VENTANA. REGRESÓ A FONDO CIRCULÓ Y ESPOTEO PÍLDORA LUBRICANTE-ESTABILIZADORA PARA CUBRIR HOYO ABIERTO. LEVANTANDO BHA #6 DIRECCIONAL DE 14,140' HASTA 4,000'.
SINOPEC 168	YRCH-031H	YURALPA CENTRO-H031H	8,830	8,830	ARMÓ PARADAS DE DRILL PIPE Y HWDP EN LA TORRE MÁS REALIZÓ CAMBIO DEL SAVER SUB DEL TOP DRIVE MÁS LEVANTÓ BOP ASENTARON SECCIÓN C SOBRE SECCIÓN A-B DEL CABEZAL MULTIBOWL
CCDC-028	APKA-017	APAIKA-A017	7,325	5,987.96	REALIZA CEMENTACIÓN DE ACUERDO A PROGRAMA + R/D UNIDAD, LÍNEAS Y CABEZA DE CEMENTACIÓN + RETIRA TUBO DE MANIOBRA + R/D HTAS DE CORRIDA DE CSG + INSTALA PACK OFF Y PRUEBA SELLOS + INSTALA WEAR BUSHING + ESPERA FRAGÜE DE CEMENTO (WOC=23/36 HRS.)
SINOPEC 183	GCLH-020	GACELA-H020	1,248	1,247.99	SACA Y QUIEBRA STINGER, CORTA CSG, SUELDA NIPLE + VÁLVULA DE 3", INSTALA CONDUCTOR DE 20", ARMA Y BAJA BHA #02 DD HASTA 457 FT TOPE DE CEMENTO, REALIZA DRILL-OUT, PERFORA SECCIÓN 16" CON BHA #02

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Mar/3/2026 06:00 am - Mar/4/2026 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	MD	TVD	DETALLE
					DIRECCIONAL (BROCA PDC 16" + MOTOR) DESDE 467 FT HASTA 1033 FT. TOMA GYRO.
CCDC-066	ARMB-002	ARMADILLO-B002	11,497	10,266.38	CIRCULÓ CON LINER 7" BC, P-110, 26 LB/FT + COLGADOR INNOVEX X-PAK @ 9740 FT. BAJÓ LINER 7" BC, P-110, 26 LB/FT CON DP 5-1/2" DESDE 9740 FT HASTA 9937 FT. TRABAJÓ SARTA CON LINER DE 7" + COLGADOR INNOVEX X-PAK CON DP DE 5-1/2" PARA RECUPERAR PARÁMETROS. SIN ÉXITO, CIRCULÓ TÁNDEM CON 60 BLS DE PÍLDORA SELLANTE + 25 BLS DE PÍLDORA LUBRICANTE, PERDIÓ CIRCULACIÓN, TRABAJÓ SARTA CON LINER DE 7" + COLGADOR INNOVEX X-PAK CON DP DE 5-1/2" PARA RECUPERAR CIRCULACIÓN.
TRIBOILGAS-202	VNTC-022	VINITA-C022	5,529	4,401.85	PERFORA SECCIÓN DE 12 ¼" CON BHA DIRECCIONAL #4 (BROCA PDC) EN MODO ROTACIÓN / SLIDE DESDE 4300 FT HASTA ESTACIÓN DE CIRCULACIÓN A 4968 FT. REALIZA ESTACIÓN DE CIRCULACIÓN. REANUDA PERFORACIÓN DE SECCIÓN DE 12 ¼" CON BHA DIRECCIONAL #4 DESDE 4968 FT HASTA NUEVA ESTACIÓN DE CIRCULACIÓN A 5515 FT. REALIZA ESTACIÓN DE CIRCULACIÓN. CONTINÚA PERFORACIÓN DE SECCIÓN DE 12 ¼" CON BHA DIRECCIONAL #4 DESDE 5515 FT HASTA 5529 FT.
SINOPEC 248	PCNA-046I	PUCUNA-A046I	6,915	6,581.22	PERFORA SECCION DE 12 ¼" CON BHA#2 DIREC. DESDE 5,689 FT MD HASTA 6,580 FT MD + PERFORA SECCION DE 12 ¼" CON PARAMETROS CONTROLADOS EN CONGLOMERADO SUPERIOR TIYUYACU DESDE 6,580 FT MD HASTA 6,868 FT MD+ CONTINUA PERFORANDO DESDE 6,868 FT MD HASTA 6,915 FT MD (PUNTO DE CSG 9 5/8")+ BOMBEA PÍLDORAS LIMPIEZA HASTA TENER RETORNOS LIMPIOS + CIRCULANDO POZO DENSIFICANDO FLUIDO DE PERFORACION DE 10.6 A 10.8 PPG.
SINOPEC 220	PCNB-043	PUCUNA-B043	8,908	8,641.71	PERFORÓ CON BHA #3 DIRECCIONAL CON MOTOR, MWD/LWD Y BROCA PDC 8 1/2" DESDE 8115 PIES HASTA 8867 PIES. CIRCULÓ POZO HASTA RETORNOS LIMPIOS. REALIZÓ DESPLAZAMIENTO DEL FLUIDO POLIMERICO II DE 9.6 LPG POR FLUIDO DRILL-N DE 10.3 LPG. PERFORA CON BHA #3 DIRECCIONAL DESDE 8867 PIES HASTA 8908 PIES.
SINOPEC 156	DROG-009	DURENO-G009	6,765	6,765	SACA BHA PUNTA LIBRE DESDE 3040 FT HASTA 2467 FT + CIRCULA + SACA BHA PUNTA LIBRE HASTA SUPERFICIE + WOC + QUIEBRA PARADAS DE DP 5-1/2" + CONTINUA WOC.

EN COMPLETACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
SINOPEC 129	SCHD-621	SACHA-D621	COM	BAJA BHA #02 SAND BAILER HASTA 12081 FT, LIMPIA ARENA HASTA 12098 FT, NO SE OBTIENE MÁS AVANCE. SACA Y QUIEBRA EN SUPERFICIE BHA #02 SAND BAILER. ARMA Y BAJA BHA MOLEDOR CON JUNK MILL 6 1/8" HASTA 2200 FT.

EN MOVILIZACIÓN

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Mar/3/2026 06:00 am - Mar/4/2026 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
CCDC-069	TTTA-026	TETETE-A026	MOV	REALIZA REUNIÓN DE SEGURIDAD Y CONTINUA ARMANDO EQUIPO EN LOCACION TTTA-026

EN WORKOVER

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
BRASERV-101	CNOE-030	CONONACO-E030	05	BAJÓ BHA#2 DE AISLAMIENTO EN DRILL PIPE CDS-38 EN PARADAS HASTA 10638 FT (CENTRO DE GOMAS RBP), CORRELACIONÓ MARCA RADIOACTIVA CON WL , ASENTÓ RBP A 10638 FT, LEVANTÓ Y ASENTÓ PACKER HD REALIZÓ PRUEBA DE PRESIPON CON 1000 PSI, DESASENTÓ 7 IN PACKER HD, ESPOTEO 15 BLS DE PÍLDORA VISCOSA DE RPI SOBRE RBP
CCDC-052	PRHH-031	PARAHUACU-H031	03	INSTALÓ CABEZAL Y BAYONETA, REALIZÓ CONEXIÓN DE CONECTOR SOBRE CABEZAL, BAJÓ TORRE, ARRANQUE DE POZO.
DRILLCOTEC-020	EDYK-173	EDEN YUTURI-K173	09	PERSONAL CIA. DRILLCOTEC REALIZA REUNIÓN DE SEGURIDAD, REVISY Y PRUEBA SISTEMA HIDRÁULICO DE LA TORRE, BAJA SEGUNDA Y PRIMERA SECCIÓN POZO EDYK-109 MOVILIZA EQUIPO DEL RIG DRILLCOTEC 20 DESDE EL POZO EDYK 109 HASTA EL POZO EDYK 173; EQUIPO MOVIDO 100% Y ARMADO: 100% SUBIDA DE TORRE, REVISY Y PRUEBA SISTEMA HIDRÁULICO. LEVANTA PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN DE LA TORRE Y ASEGURA VIENTOS EN POZO EDYK-173 PERSONAL CIA. DRILLCOTEC ARMA, LÍNEAS DE 4" Y 2" AL MECHERO PARA DESGASIFICAR PERSONAL DE CIA. DRILLCOTEC DESPRESURIZA CASING Y TUBING AL TANQUE BOTA Y QUEMA GAS EN EL MECHERO. CONTROLA POZO, EN DIRECTA TUBING - CSG ATRAVEZ DEL INTAKE@ 7812 FT AL TANQUE LODOS DEL RIG CON AGUA DE FORMACION @ 1,0 BPM CON 1700 PSI DE PRESIÓN EN BOMBA.
GEOPETSA-03	LGA-009	LAGO AGRIO-009	22	MOVILIZO EQUIPO GP-03 DESDE POZO LGA-009 HASTA LGAJ-061. 22/22 CARGAS MOVILIZADAS. EQUIPO MOVILIZADO 100 %. MOVILIZO SET DE FRACTURA Y ARMO EQUIPO. RIG UP SET FRACTURA 70%
GEOPETSA-05	PLAC-017	PALO AZUL-C017	13	BAJA TUBERÍA PUNTA LIBRE HASTA 10689 FT, LEVANTA SARTA 3 FT y CIRCULA EN REVERSA CON FLUIDO DE CONTROL DE 8.9 PPG (149 BLS). SACA (02) PARADAS DE DRILL PIPE DE 3 ½" DS38, REALIZA PRUEBAS DE ADMISIÓN A LA ARENA "HOLLÍN" CON 10 BLS DE BACHE LIMPIADOR. PREPARA FLUIDOS y REALIZA TAPÓN DE CEMENTO BALANCEADO A INTERVALOS DE LA ARENA "HOLLÍN" INYECTANDO 5 BLS DE CEMENTO CON UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 1500 PSI. CIERRA POZO.
HILONG 18	PKNB-023	PAKA NORTE-B023	02	BAJA BHA #54 DE MOLIENDA Y ACONDICIONAMIENTO CON 8 3/8" ROTARY SHOE EN TUBERIA 3 1/2" IF DRILL PIPE EN PARADAS HASTA 9004 FT, INSTALA KELLY SWIVEL SOBRE LA SARTA, CIRCULA 680 BLS EN REVERSA Y BAJA SARTA HASTA 9004 FT, DESPLAZA PILDORA VISCOSA, CONTINUA MANIOBRA DE MOLIENDA Y ACONDICIONAMIENTO SOBRE CABEZA DE PESCADO DESDE 9004 FT HASTA 9005 FT (1 FT AVANCE), CIRCULA 680 BLS EN REVERSA Y BAJA SARTA HASTA 9005 FT, CONTINUA MANIOBRA DE MOLIENDA Y ACONDICIONAMIENTO SOBRE CABEZA DE PESCADO A 9005 FT, CIRCULA 680 BLS EN REVERSA Y BAJA SARTA HASTA 9005 FT.
INDEPENDENCE	OSOG-065	OSO-G065	01	REALIZÓ MINI MOVE (30 m) DESDE EL POZO OSO G-088 HASTA OSO

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Mar/3/2026 06:00 am - Mar/4/2026 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
126				G-065R1, CON CÍA GRÚAS ATLAS, PISICIONÓ TANQUE DE LODOS , DOS TANQUES DE AGUA, CASETA DE ACUMULADOR, CASETA DE GENERADORES. REALIZÓ CONEXIÓN ENTRE TANQUES PARTE ELÉCTRICA, CONECTÓ MANGUERAS. POSICIONÓ BASE DEL RIG + POSICIONÓ CARRIER, LEVANTÓ DOS SECCIONES DE LA TORRE OK. CONECTÓ LÍNEAS PARA CONTROL DE POZO. REALIZÓ PRUEBAS DINÁMICAS. DESPRESURIZÓ POZO. LLENÓ TANQUES CON AGUA FILTRADA. PREPARÓ 650 BLS DE FLUIDO DE CONTROL. CONTROLÓ POZO EN REVERSA (CSG – TUBING). (EN PROCESO)
INDEPENDENCE 126	OSOG-088	OSO-G088	02	INSTALÓ MANÓMETROS + LÍNEAS CAPÍLARES DE INYECCIÓN DE QUÍMICOS. REALIZÓ PRUEBA DE ROTACIÓN DEL EQUIPO BES OK. ALINEAR FLUJO PARA MANIFOLD DEL PAD. FINALIZÓ OPERACIONES DE PULLING DEL POZO OSO G-088 WO#02 EL DÍA 3 DE MARZO DEL 2026 A LAS 8:00 HRS
OCIPAG 01	CYBF-036	CUYABENO-F036	12	CIA. F&T CONTINUA MOLRIENDO PARTE EXTERNA DEL PESCADO DESDE 829' HASTA 834' (5'). SACA BHA #25 MOLENDOR EN DP 3 1/2" IF EN PARADAS. S/L BAJA BLOQUE IMPRESOR 5 3/4". BAJA ARPON + SACA Y RETIRA. ARMA BHA #27 MOLENDOR CON ZAPATA 8 1/2".
ORD-903	PYMN-019	PAYAMINO-N019	03	CONTINUA BAJANDO BHA # 4 PARA LIMPIEZA DE PUNZADOS EN TBG 3-1/2" COMBINADO HASTA 9083.55'; TOTAL 302 JTS. S/L RECUPERA STD VALVE DESDE NOGO @ 9041.58'. ASIENTA PACKER 7" @ 9047.30'. ARMA EQUIPO DE BOMBEO CIA. HALL. LLENA EL POZO, VERIFICA CIRCULACION. PRUEBA ADMISIÓN CON 10 BLS, OK. CIA. HALL PREPARA TRATAMIENTO PARA LIMPIEZA DE PUNZADOS, BOMBEA 1RA PARTE DEL TRATAMIENTO Y REMOJA.
ORD-904	PCND-033	PUCUNA-D033	02	WIRELINE HALLIBURTON ARMANDO EQUIPO Y HERRAMIENTAS, BAJA HERRAMIENTAS REALIZANDO PASADA DE CORRELACION DESDE 13450 FT - 13250 FT (200 FT). REALIZA PASADA DE VERIFICACION DESDE 13450 FT - 13250 FT (200 FT). RBP ASENTADO A 13390 FT. ARMA BHA DE PRUEBA CON ETI HD RETREVBABLE PACKER 5.875" OD FOR 7" CSG - 2 7/8" EUE, BAJA EN TUBERIA 3 1/2" 9.30 LBS/FT, L-80 EUE, SUBIENDO TUBO A TUBO DESDE LOS CABALLETES MIDIENDO, CALIBRANDO Y PROBANDO CON PRESION CADA 2000 FT CON 2500 PSI HASTA 6105'.
PETROELF 6357	SCH-044	SACHA-044	12	SE CONTINUA SACANDO BHA #6 CON MULE SHOE HASTA SUPERFICIE Y DESARMA; ARMAN Y BAJAN BHA #7 MOLENDOR DE CIA DYNADRILL LLEGANDO AL TOPE 8651 FT, POR TAL MOTIVO SE DECIDE SACAR BHA #7 MOLENDOR PARA ESPOTEAR MAYOR VOLUMEN DE CEMENTO HASTA 8086 FT COMO OBJETIVO; SACAN BHA #7 MOLENDOR DE CIA DYNADRILL EN 3-1/2" DRILL PIPE, EN PARADAS A 7585 FT FUERA DEL POZO.
RIG-30	YNOA-015	YANAQUINCHA OESTE-A015	06	BAJA LLAVE HIDRAULICA. SUBE LLAVES DEL RIG. ARMA Y BAJA BHA #1 DE PESCA CON OVERSHOT HASTA 8918 FT. TRABAJA SARTA Y ENGANCHAS PESCADO. LEVANTA SARTA HASTA 8824 FT. CIRCULA POZO VIA DP-CSG. SACA BHA #1 DE PESCA EN PARADAS HASTA 7718 FT.
SINOPEC 932	ACAD-099	AUCA-D099	06	PRUEBA HERMETICIDAD DE SARTA HASTA VÁLVULA PTV CON 8500 PSI / 15 MIN. PRUEBA NO SATISFACTORIA. DESARMA LÍNEAS DE RPI. SACA BHA #05 DE FRACTURA EN SENCILLOS
SINOPEC 933	CLBB-014	CULEBRA-B014	04	DESARMA BHA#15 DE LAVADO CON 4 ¼" ROTARY SHOE TOMA ECHOMETER, NIVEL A 772 FT ARMA BHA # 16 DE ACONDICIONAMIENTO DE TOL 7" CON TAPER MIL 6", POLISH MILL 7 ½" Y DRESSED MILL 8

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Mar/3/2026 06:00 am - Mar/4/2026 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
				BAJA BHA # 16 EN PARADAS DE DRILL PIPE NC-38 HASTA 8261 FT ACONDICIONA TOL DE 7" A 8261 FT SACA BHA # 16 DE ACONDICIONAMIENTO DE TOL 7" CON TAPER MIL 6", POLISH MILL 7 ½" Y DRESSED MILL 8" EN 3-1/2" DRILL PIPE NC-38, S-135 EN SENCILLOS
SINOPEC 976	ACAQ-116	AUCA-Q116	04	INTENTA SACAR TUBERÍA 3 1/2" EUE N80 9.3# Y EVIDENCIA RESTRICCIÓN. TRABAJA SARTA EN VARIAS OCASIONES, SIN ÉXITO. DESARMA HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SLB-WL. ARMA UNIDAD DE SLB-SLK Y RECUPERA STD. VALVE 2.25" EN NOGO A 10973 FT. ASIENTA STANDING VALVE DE 2.125" EN NOGO A 11212 FT. REALIZA MANIOBRA DE ASENTAMIENTO DE SCAB LINER CON PACKERS MRP, PRESURIZA CON 3500 PSI, OK. REALIZA PRUEBA DE HERMETICIDAD EN EL ESPACIO ANULAR CON 1000 PSI POR 15 MIN, OK. RECUPERA STANDING VALVE DE 2.125" DESDE NOGO A 11212 FT. RIG UP UNIDAD WL-WELLPERF. ARMA HERRAMIENTAS CCL-CORTE FLAMA Y BAJAN A REALIZAR CORTE EN TUBING 3 1/2" EUE SOBRE EL PACKER MRP SUPERIOR.
SINOPEC-903	SHSW-198	SHUSHUFINDI-W198	01	REALIZAN MOVILIZACION DE EQUIPOS Y CAMPAMENTO DESDE SHSA-290 WO#08 HASTA SHSW-198 WO#01 (REINICIO), DISTANCIA: 16,4 KM. RE-INICIA OPERACIONES CON EL RIG SINOPEC-903 EN EL POZO SHSW-198 WO #01 EL DÍA 03 DE MARZO 2026 A LAS 17:00 HRS. ARMAN LINEAS DE CONTROL, SE PREPARA 100 BLS DE FLUIDO DE CONTROL ESPECIAL 8.4 PPG. SE CONTROLA POZO POR NIVELES 15 BLS POR TBG Y 40 POR CSG.
SINOPEC-904	AGRA-035	AGUARICO-A035	01	SACA EQ. BES RCD4000NX HASTA SUPERFICIE CON 306 TUBOS RECUPERADOS. DESARMAN EQ. BES NOVEDADES (TAIL PIPE CON CORROSIÓN). BAJA LLAVE STP Y SUBE LLAVE DEL RIG, SL BAJA BLOQUE IMPRESOR DE 5-1/2" A 9775 FT (PROFUNDIDAD SL) Y SALE MARCA DE BANDAS 3/4". ARMAN BHA#1 DE CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA.
TRIBOILGAS-101	DRTA-012	DRAGO ESTE-A012	08	MANIOBRA ENGANCHE BWRP, SACA BHA#9 EN 3-1/2 CBS3 CR1 CLASE A ENPRDS, DESARMA BHA#9, ARMA BES (NH2100M/NH940M / 370 STG), SUBE POLEA, CONECTA MLE A POD HEAD, CONT ARMADNO BES (NH2100M/NH940M / 370 STG), ARMA BHA DE PRODUCCION, BAJA BES (NH2100M/NH940M / 370 STG) EN 3-1/2 CBS3 CR1 CLASE A EN PRDS
TRIBOILGAS-102	SHSV-227	SHUSHUFINDI-V227	04	BOMBEA 15 BLS DE PÍLDORA REMOVEDORA A 10635 FT (FRENTE AL INTERVALO SUPERIOR DE UINF: 10631' - 10637'), TOMA ECHOMETER ENCUEBTRA NIVEL DE FLUIDO A 158 FT, DETERMINA QUE PÍLDORA REMOVEDORA NO ACTUÓ. TÉCNICO SERTECPET ASIENTA 7" X 2-7/8" PCKER HD @ 10802 FT SOBE EL TOPE DE ARENA "TSUP" (10865 FT). CÍA SLB ARAMA EQUIPOS Y UNIDADES DE CTU. BAJANDO TUBERÍA DE CT A 80 FT/MIN, REALIZANDO PULL TEST CADA 2,000 FTS Y BOMBEANDO 2 BARRILES A 0.3 BPM , 10809 FT DENTRO DEL POZO (PROF. 7" OVERSHOT PARA RBP)
TRIBOILGAS-103	DRRA-003	DRAGO NORTE-A003	07	CONT SERTECPET WIRELINE MANIOBRA PARA LIBERAR HERRAMIENTA, TENSIONA CABLE DE 1000 EN 1000, MANIOBRA TENSIONANDO TUBERIA PARA ELIMINAR POSIBLE PANDEO CABLE EMPIEZA A RECORRER SIN TENSION LIBRE Y REGISTRANDO CCL, RECUPERA CABLE EN TAMBOR, RIG DOWN, MANIOBRA PARA SALIR CON UNIDAD DE SELLOS OK, SACA BHA#1 OVERSHOT Y DESARMA, SACA BHA UNIDAD DE SELLOS EN 3-1/2 TSH QUEBRANDO
TRIBOILGAS-104	SCHAQ-605	SACHA-AQ605	03	Desarman líneas de control de pozo, retiran cabezal de producción y

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Mar/3/2026 06:00 am - Mar/4/2026 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
				arman conjunto BOP, arman subestructura, levantan sarta hasta la mesa rotaria, retiran Hanger más sacan equipo BES RC1000 de Cía SLB en tubería 3-1/2" EUE en paradas.
TRIBOILGAS-105	TAPC-010	TAPI-C010	05	CONTINUO BAJANDO BHA DE PRUEBA CON 7" x 2-7/8" EUE PACKER MECANICO EN TUBERIA 3-1/2" CBS-3, CLASE "A", SUBIENDO TUBO A TUBO DESDE LOS CABALLETES MIDIENDO, CALIBRANDO Y PROBANDO HASTA LA PROFUNDIDAD DE ASENTAMIENTO DE PACKER @ +/- 9400 FT. SLICK LINE BAJO Y RECUPERO STD. VALVE 2.75", OK. ARMO CAMION BOMBA Y PROBO LINEAS CON 2000 PSI, OK. PREPARO TRATAMIENTO PARA PICKLING CON 15 BLS DE HCL AL 12%. BOMBEO Y REALIZO DE TRATAMIENTO DE PICKLING DE TUBERIA
TRIBOILGAS-106	SCHQ-469	SACHA-Q469	06	Cia. Dynadrill toman parámetros de la sarta, realizan maniobras para posicionar seal bore packer @ 10743 ft centro de gomas, más sueltan esfera metálica de 1-7/16" por tubing de la sarta de trabajo, (calibrada), realizan armado de línea 15/02 desde la unidad de bombeo de alta presión, bombean fluido de control para asentamiento de seal bore packer, realizan maniobras de asentamiento de packer mecánico, prueban hermeticidad del packer, sacan y desarman BHA #4 Cia. Dynadrill, model tst-1 o r mechanical set packer. Arman BHA #5 falso de Cia. Dynadrill.
TRIBOILGAS-107	TMSA-001	TUMALI SURESTE-A001	06	EQUIPO DESARMADO: 100%. EQUIPO EN PUERTO DUMBIQUE: 10%. EQUIPO EN POZO TMSA-001:90%. EQUIPO ARMADO 50%. CAMPAMENTO DESARMADO: 100%. CAMPAMENTO EN PUERTO ZETO: 60%. CAMPAMENTO EN POZO TMSA-001: 40%. CAMPAMENTO ARMADO: 40%.
TRIBOILGAS-201	PLNA-014	PALMERAS NORTE-A014	02	BAJA BHA DE EVALUACION HIDRAULICA HASTA 11759.09 FT. INSTALA TBG HANGER Y PRUEBA. ASIENTA PACKER Y PRUEBA PRESION OK. DESARMA SUBESTRUCTURA Y BOP. ARMA CABEZAL. S/L ALINEA POZO PARA MTU. SUSPENDE OPERACIONES.
TRIBOILGAS-205	LMNH-020	LIMONCOCHA-H020	03	SACÓ A SUPERFICIE PIN DE ON OFF TOOL A SUPERFICIE, DESARMÓ BHA # 10, DESARMÓ Y QUEBRÓ KELLY SWIVEL, SUBIÓ LLAVES HIDRÁULICAS, UBICO SPOOLER DE CÍA. 4L, ARMO EQUIPO BES DE CÍA. SLB 400 RCXLF (100 STG+100 STG+100 STG).
TUSCANY-104	SCY-022	SECOYA-022	35	CONT. BAJANDO EQUIPO BES D3550N, DE CÍA. SLB CON CABLE #4/1 MAS CAPILAR EXTERNO EN TUBING 3-1/2" TSH BLUE (RE-RUN) TUBO POR TUBO.CAMBIO DE CARRETO VACIO POR LLENO MAS EMPALME. CONTINUA BAJANDO EQUIPO BES D3550N CON CABLE #4/1 MAS CAPILAR EXTERNO EN TUBING 3-1/2" TSH BLUE (RE-RUN) TUBO POR TUBO. ACTIVIDAD EN PROCESO
TUSCANY-105	SHSH-186	SHUSHUFINDI-H186	07	PERSONAL DE SLB ARMAR Y PRUEBA EQUIPOS DE CTU EN SUPERFICIE. BAJA COILED TUBING HASTA 10942 FT.PREPARA MEZCLA, DESPLZA Y REALIZA PRUEBA DE ADMISION CON 10 BLS EN ARENA "U SUP" @1.1 BPMY 0 PSI. PREPARA MEZCLA ACIDA Y DESPLAZA HASTA PUNTA DEL COILED TUBING
TUSCANY-111	ACAH-195	AUCA-H195	04	REALIZO LIMPIEZA DE RESTOS SOBRE CIBP DESDE 10958.5 HASTA 10965 FT. AVANCE EFECTIVO: 6.5 FT. CIRCULO 20 BBL DE PILDORA VISCOSA EN REVERSA, HASTA RETORNOS LIMPIOS. SACA BHA # 11 DE LIMPIEZA Y MOLIENDA DE CIBP EN TUBERÍA 3 1/2" DP (NC-38) EN PARADAS

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Mar/3/2026 06:00 am - Mar/4/2026 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
VICTORIA 01	SCHM-332	SACHA-M332	09	DESARMA EQUIPO BES CIA HALLIBURTON, ARMA Y BAJA BHA DE LIMPIEZA EN 3-1/2 EUE TBG POR PARADAS DESDE LA TORRE, RECUPERA STANDING VALVE, SACA BHA DE LIMPIEZA POR PARADAS.
VICTORIA 03	EDYB-047	EDEN YUTURI-B047	05	BAJA BHA # 05 DE PESCA CON 4-1/8" DIE COLLAR, INSTALA KELLY SWIVEL, TÉCNICO DE CIA WIS REALIZA MANIOBRA DE PESCA, RETIRA KELLY SWIVEL + SACA BHA # 05 DE PESCA, DESARMA BHA #5 HASTA 3-1/2" CROSSOVER. DENTRO DEL POZO QUEDA LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS (3-1/8" LUBRICADOR BUMPER SUB, 3-1/8" SAFETY JOINT, (1) CROSS OVER 3-1/8" + (1) CROSSOVER 3-3/4" + (1) DIE COLLAR 4 1/8".
VICTORIA 04	SCHW-257	SACHA-W257	01	SACA BHA DE LIMPIEZA QUEBRANDO TUBERIA DRILL PIPE A LOS CABALLETES, DESARMA BHA, QUIEBRA KELLY, ARMA Y BAJA BHA DE PRUEBA EN 3-1/2 CBS3 TUBING SUBIENDO TUBO A TUBO DESDE LOS CABALLETES.
VICTORIA 05	SCHAO-610	SACHA-AO610	02	Cia. Dygoil Slic Line arma herramientas con 10 ft de barra de peso, con shiffing tool de 3 1/2" baja para abrir camisa de circulación. Cia. Sertecpet desplazó bomba jet convencional 12K. Asienta camisa, realiza pruebas y evalua pozo.
VICTORIA 06	SCHB-178	SACHA-B178	13	DESARMAR BHA DE PRUEBA #02 DE CIA SERTECPET CON PACKER RECUPERABLE (RBP) DE 7" MIENTRAS MOVILIZAN HERRAMIENTAS DE SIGUIENTE BHA RIG SE ABASTECE DE FLUIDOS EN LOS TANQUES, ARMAN BHA #03 DE PRUEBA CIA SLB CON 4" UNIDAD DE SELLOS MAS PACKER MECANICO HD 7" X 2-7/8 EUE BOX X PIN EN 3-1/2" CDS38 TUBERIA + BAJA EN POZO
ZHONG YOU HAI 12 (CPOE-12)	AMSA-016	AMISTAD-A016	01	ARMA CABEZAL PASAN CAPILARES A TRAVÉS DE LA SECCIÓN C, REALIZA EMPALME DE LA LÍNEA ELÉCTRICA REGISTRA PARÁMETROS ELÉCTRICOS COLOCA CONECTOR DE SUPERFICIE Y CONECTA CONSOLA DE AUTOMATIZACIÓN DE PEC. CONECTA TUBO DE MANIOBRA REALIZA PRUEBA DE HERMETICIDAD SECCIÓN "C" SLICK LINE RECUPERA STD VALVE 2.75 BAJA STD VALVE 2.25" PRESURIZAR ANCLAR PACKER PROBAR ANULAR SLICK LINE RECUPERAR STD VALVE 2.25 ABRIR CAMISA ALINEAR POZO A LA ESTACIÓN SOLTAR BARRA ACCIONAR CAÑONES REALIZAR PRUEBA DE PRODUCCIÓN HACIA LA ESTACIÓN

* Pozos con eventos abierto

No hay datos disponibles
