
# SUMARIO DE OPERACIONES

## OPERACIONES CON TORRES: Nov/5/2026 06:00 am - Nov/6/2026 06:00 am

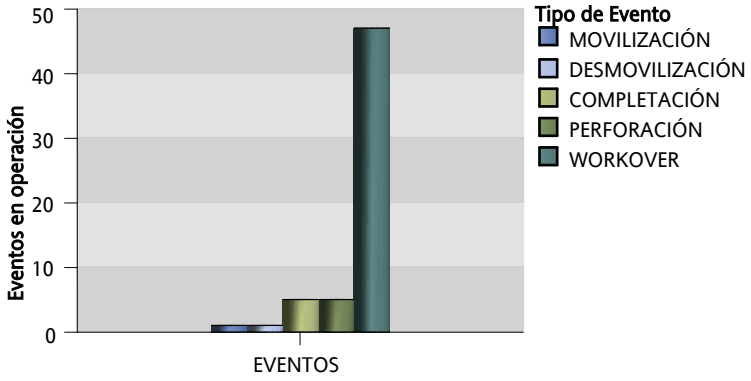


## EN PERFORACIÓN

| TALADRO | POZO | NOMBRE POZO | MD | TVD | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|
| SINOPEC 129 | SCHAD-617 | SACHA-AD617 | 11,417 | 9,401.58 | PERFORA CON BHA #5 DIRECCIONAL (8.5" BROCA PDC + MOTOR) DESDE 11336' HASTA 11417' + SACA BHA #5 HASTA ZAPATO DE 9 5/8" + CIRCULA UN FONDO ARRIBA + SACA BHA #5 HASTA 1005.45' + QUIEBRA BHA #5 DIRECCIONAL (8.5" BROCA PDC + MOTOR) + ARMA BHA #6 DIRECCIONAL (8.5" BROCA PDC + ICRUISE) + BAJA BHA #6 DIRECCIONAL EN 5.5" JSHET54 DP EN PARADAS HASTA 3000' |
| SINOPEC 907 | YRCH-037 | YURALPA CENTRO-H037 | 10,696.5 | 10,696.5 | CONTINÚO SACANDO Y DESARMANDO BHA No 04 BHA DIRECCIONAL CON PD 475 ORBIT MÁS MWD MÁS BROCA PDC DE 6-1/8" MÁS ARMÓ Y BAJÓ BHA No 05 DIRECCIONAL CON MWD MÁS LWD CON BROCA PDC 6-1/8" |
| CCDC-028 | APKA-025 | APAIKA-A025 | 5,765 | 5,203.42 | BAJA CSG DE 13-3/8" HASTA 5765 FT + CIRCULA + CONECTA CABEZA DE CEMENTACIÓN + REALIZA CEMENTACIÓN DEL CSG 13 3/8" + RETIRA CABEZA DE CEMENTACIÓN + RIG DOWN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CASING TEAM + REALIZA TOP JOB + SUELDA MEDIAS LUNAS ENTRE CSG DE 13-3/8" Y CSG DE 20" + REALIZA CORTE EN BRUTO DE CSG 13-3/8" + LEVANTA Y RETIRA TUBO CORTADO + REALIZA CORTE EN FRÍO Y BISELA CSG DE 13-3/8". |
| CCDC-069 | TTTC-028 | TETETE-C028 | 9,700 | 7,561.61 | PERFORA SECCIÓN DE 12-1/4 CON BHA #03 DIRECCIONAL (BROCA PDC 12-1/4" + MOTOR + MWD + MITIGATOR) DESDE 9036 FT HASTA 9700 FT |
| SINOPEC 168 | PCND-048 | PUCUNA-D048 | 8,145 | 6,020.41 | SACA BHA #03 DIRECCIONAL (BROCA PDC 16” + MOTOR + DRILLDOC) HASTA 6015 FT. REALIZA ESTACIÓN DE CIRCULACIÓN A 6015 FT. CONTINUA SACANDO BHA #03 DIRECCIONAL (BROCA PDC 16” + MOTOR + DRILLDOC) HASTA 4515 FT. REALIZA ESTACIÓN DE CIRCULACIÓN A 4515 FT. CONTINUA SACANDO BHA #03 DIRECCIONAL (BROCA PDC 16” + MOTOR + DRILLDOC) HASTA 2580 FT. REALIZA ESTACIÓN DE CIRCULACIÓN. CONTINÚA SACANDO BHA #03 DIRECCIONAL (BROCA PDC 16” + MOTOR + DRILLDOC) HASTA SUPERFICIE Y QUIEBRA. ARMA HERRAMIENTAS DE CORRIDA DE CASING. RDS + ARMA SHOE TRACK Y PRUEBA EQUIPO DE FLOTACIÓN. |

## EN COMPLETACIÓN

# SUMARIO DE OPERACIONES

## OPERACIONES CON TORRES: Nov/5/2026 06:00 am - Nov/6/2026 06:00 am

| TALADRO | POZO | NOMBRE POZO | No | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| CCDC-077 | DRRA-034 | DRAGO NORTE-A034 | COM | BAJANDO EQUIPO BES WD3000 DE CIA. ALKHORAYEF EN 3-1/2 EUE DESDE 1327 FT HASTA 3844 FT. REALIZA CAMBIO DE CARRETO EN SPOOLER. CONTINUA BAJANDO EQUIPO BES WD3000 CIA. ALKHORAYEF EN 3-1/2" EUE DESDE 3844 FT HASTA 6081 FT. |
| SINOPEC 191 | SCHAK-434 | SACHA-AK434 | COM | BAJA TUBERÍA 3 1/2" MLT-2 PUNTA LIBRE TUBO A TUBO HASTA DESDE 9000 FT HASTA 10776 FT + SLICKLINE RECUPERA 2.75" STD VALVE + REALIZA PICKLING + PROFUNDIZA TUBERÍA HASTA 11460 FT + CAMBIA AGUA FRESCA POR FLUIDO DE CONTROL DE 8.4 PPG + SACA TUBERÍA 3 1/2" MLT-2 PUNTA LIBRE EN PARADAS HASTA SUPERFICIE + ARMA CONJUNTO TCP CON CAÑONES 4.5" OD Y PACKER MECÁNICO |
| SINOPEC 220 | NAPA-005 | NAPO-A005 | COM | CONTINUO SACANDO BHA SELECTIVO DE EVALUACION EN 3 1/2" EUE TUBING, QUEBRANDO JUNTA POR JUNTA A LOS RACKS, CAMBIA COUP´LING BICELADOS POR COUPLING NORMAL A TIUBERIA QUE INGRESO AL LINER DE 7" + DESARMA BHA SELECTIVO DE EVALUACION |
| SLR-401 | ACAL-238H | AUCA-L238H | COM | RECORRE Y COTA CABLE DE PERFORACIÓN. RETIRA WEAR BUSHING, INSTALA TEST PLUG Y REALIZA PRUEBA DE PRESIÓN AL BOP STACK 13 5/8" 10M. DESINSTALA TEST PLUG Y COLOCA WEAR BUSHING. BAJA AL POZO EN PUNTA LIBRE 46 PARADAS DE DRILL PIPE NC-38, 13.3#, S-135 Y PROCEDE A SACAR JUNTA POR JUNTA. |
| SLR-402 | SHST-242 | SHUSHUFINDI-T242 | COM | UBICAN CAMIÓN DE WIRE LINE Y ARMAN HERRAMIENTAS. ARMAN CAÑÓN VACÍO DE 4 1/2" CON CCL Y GR, BAJAN, CORRELACIONAN Y CONSTATAN FONDO OPERATIVO EN 11042 FT. DESARMAN EQUIPO DE WIRE LINE. ARMAN Y BAJAN BI DE 5 3/4" CON UNIDAD DE SL. TOMAN ECHOMETER. ARMAN Y BAJAN BHA # 3 DE PESCA MANIOBRAR PARA PESCAR 2 JUNTAS DP Y MULE SHOE. |

## EN DESMOVILIZACIÓN

| TALADRO | POZO | NOMBRE POZO | No | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| SINOPEC 127 | LOBC-013H | LOBO-C013H | DMOV | PERSONAL DE LA COMUNIDAD GARCÍA MORENO PARALIZA OPERACIONES DE DESMOVILIZACIÓN, SUSPENSIÓN PARCIAL DEL CONTRATO N° 2025506 DESDE EL 05 NOVIEMBRE DEL 2026 A LAS 18:00 HRS DEBIDO A CONDICIÓN DE FUERZA MAYOR NO ATRIBUIBLE A LA CONTRATISTA (PARO DE LA COMUNIDAD GARCÍA MORENO). |

## EN MOVILIZACIÓN

| TALADRO | POZO | NOMBRE POZO | No | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| SINOPEC 219 | SCHAS-515 | SACHA-AS515 | MOV | REALIZA REUNIÓN DE SEGURIDAD. MOVILIZA CARGAS EN LOCACIÓN SACHA 510 DESDE EL POZO SCHAS-514 HACIA EL POZO SCHAS-515. RIG DOWN 40 % + RIG MOVE 45% + RIG UP 35% |

## EN WORKOVER

| TALADRO | POZO | NOMBRE POZO | No | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| BRASERV-101 | ACAF-163 | AUCA-F163 | 05 | GESTIONÓ LOGÍSTICA PARA RECIBIR CARRETOS DE CABLE DE POTENCIA. CAMBIÓ CARRETO DE CABLE EN SPOOLER.<br>TÉCNICO DE ATL REALIZÓ EMPALME DEL CABLE DE POTENCIA |
| BRASERV-101 | ACAF-163 | AUCA-F163 | 05 | |

# SUMARIO DE OPERACIONES

## OPERACIONES CON TORRES: Nov/5/2026 06:00 am - Nov/6/2026 06:00 am

| TALADRO | POZO | NOMBRE POZO | No | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| CCDC-052 | GNTD-047 | GUANTA-D047 | 05 | SACÓ Y DESARMÓ BHA DE TAPÓN BALANCEADO, ARMÓ BHA DE MOLIENDA CON JUNK MILL 6-1/8", BAJÓ EN PARADAS CON DP 3.5 IF HASTA +/- 9939 PIES, MOLIENDO CEMENTO. |
| DRILLCOTEC-020 | EDYH-149H | EDEN YUTURI-H149H | 06 | BAJA BHA # 06 DE CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA HASTA 7103 FT. LIMPIA POZO DESDE 7103 FT HASTA 7175 FT. PIERDE CIRCULACIÓN. PREPARA Y BOMBEA 30 BLS DE PÍLDORA ANTIPÉRDIDA. CIRCULA POZO EN REVERSA, SIN RETORNOS EN SUPERFICIE. |
| DYGOIL-30 | PLNA-002 | PALMERAS NORTE-A002 | 04 | BAJAN BHA #1 DE PRUEBA HASTA 10982 FT. RECUPERA STD. VALVE CON SLICK LINE. ASIENTA PACKER MECANICO. CALIBRA POZO HASTA 11431 FT. RETIRA PLANCHADA. RIG UP CTU. |
| GEOPETSA-04 | PCNB-014 | PUCUNA-B014 | 10 | CONT. BAJANDO BHA DE LIMPIEZA CON TBG BAILER ROTATORIO EN DRILL PIPE COMBINADO DE 2 7/8" Y 3 1/2", DESDE 6,700' HASTA 8,743' MD + TOMA ECHOMETER (NIVEL DE FLUIDO @ 6,652 PIS) + CONT. BAJANDO BHA DE LIMPIEZA CON TBG BAILER ROTATORIO HASTA CONTACTAR TOPE DE ARENA @ 9,661' MD + REALIZA MANIOBRA CON TBG BAILER TRABAJANDO SARTA AXIALMENTE, VERIFICANDO AVANCE POR TRAMOS DE 2-5 PIES, DESDE 9,661' HASTA TOPE DE WRBP ENCONTRADO @ 9,726' MD (65 PIES) + SACA BHA DE LIMPIEZA CON TBG BAILER ROTATORIO, EN PARADAS DE 3 1/2" DRILL PIPE DESDE 9,726' HASTA TOPE DE BHA @ 1,037' MD + DESARMA BHA DE LIMPIEZA CON TBG BAILER |
| HILONG 28 | PCNA-017 | PUCUNA-A017 | 05 | CON BHA#04 CON TUBING BAILER REALIZO LIMPIEZA DE ARENA DESDE 9730 FT HASTA 9760 FT. REALIZO ECHOMETER. SACO Y DESARMO BHA #04. ARMO BHA#05 CON RETRIEVING TOOL. |
| OCIPAG 01 | VNTB-008 | VINITA-B008 | 02 | DESASIENTA PACKER + RECUPERA RBP. SACA BHA DE PRUEBA #2 EN TBG 3 1/2" EUE EN PARADAS DESDE 7030' HASTA SUPERFICIE + DESARMA ARMA EQUIPO BES FLEX7ER DE CIA. BAKER + BAJANDO EN TBG 3 1/2" EUE (RE-RUN) EN PARADAS. A LAS 06H00 DENTRO DEL POZO 1400'. |
| ORD-903 | PYMM-018 | PAYAMINO-M018 | 16 | ALMACENA AGUA FRESCA Y PREPARA 500 BLS DE FLUIDO DE CONTROL ESPECIAL 8.4 LPG. CONTROLA POZO CSG-TBG, MONITOREA OK. DESARMA SECCION C. ARMA BOP. LEVANTA SARTA Y DESARMA HANGER. SACA EQUIPO BES (RC1000 / 300 STG) DE CIA. SLB QUEBRANDO TBG 3-1/2" EUE. RECUPERA 1492' CABLE BES SUPERIOR. FUERA DEL POZO 4693' CON 150 JTS. |
| ORD-904 | PATA-006 | PATA-A006 | 09 | ARMA BARRA DE PESO DE 1 11/16" + CCL 1 11/16" + CORTADOR FLAMA DE 1 3/4". BAJA HASTA 9890 FT, ACCIONA CORTADOR A 9850 FT; SE TRABAJA TUBERIA DRILLPIPE DESDE 170 KLBS HASTA 270 KLBS, SIN EXITO. CIRCULA EL POZO EN CIRCUITO CERRADO AL TANQUE DE LODO, EN REVERSA CSG / TBG; CIA SERTECPET, 'PREPARA TRATAMIENTO DE XILENO (PREPARA 12 BLS DE XILENO) Y SOLVENTE ACIDO (PREPARA 12 BLS DE ACIDO) PRUEBA DE LINEAS 400PSI EN BAJA Y 3000 PSI EN ALTA, BOMBEO DE 12 BLS DE XILENO (DISOLVE CLAW) INICIA PERIODO DE REMOJO 2 HORAS.'CON BOMBA DEL RIG REVERSA TRATAMIENTO DE XILENO + INICIA BOMBEO DE 12 BLS ACIDO (SCALE CLAW). |
| ORD-906 | SCHK-195 | SACHA-K195 | 01 | FINALIZAN ARMANDO BHA #01 DE LIMPIEZA PARA CSG 9 578'' & LINER DE 7'' EN TÁNDEM. BAJAN BHA #01 DE LIMPIEZA PARA CSG 9 578'' & LINER DE 7'' EN TÁNDEM SUBIENDO JUNTA A JUNTA TUBERÍA 3 1/2'' DP, 13.3 LB/FT MIDIENDO, CALIBRANDO DESDE LOS CABALLETES DESDE 1419 FT HASTA 9843 FT. (FONDO OPERATIVO). REALIZAN CAMBIO DE FLUIDO DEL POZO POR FLUIDO DE CONTROL ESPECIAL DE 8.4 PPG @ 9843 FT. |

# SUMARIO DE OPERACIONES

## OPERACIONES CON TORRES: Nov/5/2026 06:00 am - Nov/6/2026 06:00 am

| TALADRO | POZO | NOMBRE POZO | No | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (OPERACIÓN EN PROCESO). |
| ORD-907 | SHHB-025 | SHUSHUQUI-B025 | 06 | SACAN COMPLETACION PPH EN 3 ½" TBG TSH BLUE EN PARADAS A LA TORRE HASTA SUPERFICIE.<br>DESARMAN BHA PPH, 100% RECUPERADO.<br>REALIZAN PRUEBA DE PRESION DE BOP, OK.<br>INSTALAN SPOOLER CÍA HLL + HERRAMIENTAS DE MANEJO DE EQUIPO BES.<br>CÍA BAKER ARMAN EQUIPO BES FLEX 7R.<br>ARMAN BHA SOBRE LA BES. PRUEBAN CON 2500 PSI, OK.<br>MEGADA DE CABLE: F-F: 4,9 .(?). F-T: 2500 (M.?). P.I: 15 (PSI). P.D: 63 (PSI). T.I: 105 (F°). T.M: 103 (°F). |
| PETROELF 6357 | SCHAC-359 | SACHA-AC359 | 02 | SACAN EQUIPO BES CON BOMBAS RCXLF DE CIA SLB HASTA SUPERFICIE Y DESARMAN.<br>CON UNIDAD DE SLICK LINE SACANDO BLOQUE IMPRESOR DE 5.62" A SUPERFICIE. BLOQUE SALE CON MARCAS DE BANDA Y PASA CON RESTRICCION EN EL TOL; POR PRESENCIA DE GAS SE DIRECCIONA POZO AL TANQUE BOTA PSI CSG: 20 PSI. |
| SINOPEC 933 | ACAP-177 | AUCA-P177 | 08 | ARMA SECCION C. CONECTO CONECTOR DE SUPERFICIE. RIG DOWN.<br>REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. FINALIZA OPERACIONES. |
| SINOPEC 976 | CLBC-041H | CULEBRA-C041H | 02 | SACA EQUIPO BES S4000N EN SENCILLOS DE TBG 3 1/2" EUE HASTA SUPERFICIE.<br>DESARMA BHA DE PRODUCCIÓN SOBRE EQUIPO BES.<br>DESARMA EQUIPO BES S4000N.<br>TOMA NIVEL DE FLUIDO CON ECHOMETER, DETERMINA NIVEL A 6560 FT.<br>BAJA LLAVE HIDRÁULICA Y HERRAMIENTAS MANUALES DE MISSION PETROLEUM.<br>RETIRA UNIDADES DE SPOOLER<br>SUBE LLAVE HIDRÁULICA Y HERRAMIENTAS MANUALES PARA MANEJO DE DP 3 1/2" NC-38<br>ARMA Y CUELGA KELLY SWIVEL.<br>ARMA BHA #1 DE CALIBRACIÓN Y LIMPIEZA CON 6" JUNK MILL.<br>BAJA BHA #1 EN SENCILLOS DE DP 3 1/2" NC-38. |
| SINOPEC-903 | SHSAG-117 | SHUSHUFINDI-AG117 | 02 | BAJA BHA # 01 DE PESCA CON 6" ARPON EN 3-1/2" DP SUBIENDO TUBO A TUBO HASTA 10233 FT. CORTA Y RECORRE CABLE DE PERFORACION. MANIOBRA PARA ENGANCHAR CABLE/CAPILAR. SACA BHA # 01 DE PESCA CON 6" ARPON EN 3-1/2" DP EN PARADAS FUERA DEL POZOO 7000 FT |
| SINOPEC-904 | SHSG-159 | SHUSHUFINDI-G159 | 05 | DESARMA BHA #02 CON ARPON (RECUPERA 1 FT DE CABLE) SLICK LINE, BAJA BLOQUE IMPRESOR 5-3/4" (MARCA PUNTA DEL TUBO). ARMA Y BAJA BHA #03 DE PESCA CON OVER SHOT" HASTA 1087 FT, ENGANCHA PESCADO, TENSIONA SARTA HASTA 80 KLBS, SARTA SE DESPRENDE, PESO CAE A 18 KLBS.. SACA BHA #03 DE PESCA Y DESARMA. SE RECUPERA 17 FT DE TUBO 2-7/8" TSH. BAJA BLOQUE IMPRESOR 5-3/4" (MARCA DE CABLE Y CAPILAR). ARMA Y BAJA BHA #04 CON 9-5/8" ARPON HASTA TOF @ 1121 FT, MANIOBRA SARTA CABLE SE DESPRENDE CON 4 KLBS DE OVERPULL. SACA BHA #04 DE PESCA Y DESARMA (RECUPERA 15 FT DE CABLE). SLICK LINE BAJA BLOQUE IMPRESOR 5-3/4" ( MARCA DE PUNTA TUBO 2-7/8"). ARMA Y BAJA BHA #05 DE PESCA CON OVER SHOT 5-3/4" HASTA 1120 FT, MANIOBRA SARTA Y ENGANCHA PESCADO, SARTA QUEDA EN TENSIÓN CON 40 KLBS. CIA. |

# SUMARIO DE OPERACIONES

## OPERACIONES CON TORRES: Nov/5/2026 06:00 am - Nov/6/2026 06:00 am

| TALADRO | POZO | NOMBRE POZO | No | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | PETROTECH SLICK LINE BAJA CALIBRADOR 1.75" NO PASA DEL TOPE DE PESCA @ 1102 FT. TENSIONA SARTA HASTA 90 KLBS PARA LIBERAR PESCADO, SARTA SE DESPRENDE, PESO CAE A 20 KLBS. SACA BHA #05 EN PARADAS Y DESARMA (RECUPERA 12 FT DEL TUBO # 34 + 06 TUBOS 2-7/8" TSH BLUE + 19 FT DEL TUBO # 41 (LONGITUD RECUPERADA 211 FT), TUBERÍA INTERNAMENTE CON DESGASTE Y PRESENCIA DE CORROSIÓN. ARMA Y BHA #06 CON ARPON HASTA 1317 FT, REALIZA MANIOBRAS DE PESCA CABLE SE DEPRENDE CON 4 KLBS DE OVERPULL. SACA BHA #06 DE PESCA Y DESARMA ( RECUPERA 18 FT DE CABLE).ARMA Y BAJA BHA CON 8" BLOQUE IMPRESOR . |
| SINOPEC-905 | SHS-072 | SHUSHUFINDI-072 | 14 | REALIZÓ LAVADO SOBRE TOF CON ROTARY SHOE A 2594.5 FT SIN EVIDENCIAR AVANCE. BOMBEÓ 30 BLS DE PÍLDORA VISCOSA EN REVERSA HASTA RETORNOS LIMPIOS. SACÓ Y DESARMÓ BHA #33 DE LAVADO CON ROTARY SHOE. (CANASTAS, ZAPATA, EXTENSIÓN SALEN VACÍAS). BAJÓ 4-1/4" BLOQUE IMPRESOR HASTA 2576 FT, Y NO EVIDENCIA MARCA DEFINIDA. ARMÓ Y BAJÓ BHA #34 CON SHORT CATCH EN 3-1/2" NC38 DRILL PIPE EN PARADAS HASTA BAJO BHA #34 CON SHORT CATCH EN 3-1/2" NC38 DRILL PIPE EN PARADAS HASTA 2588 FT. REALIZO MANIOBRA DE PESCA SIN ÉXITO Y RECUPERO BHA A SUPERFICIE. BAJÓ 4-1/4" BLOQUE IMPRESOR HASTA 2585 FT, Y EVIDENCIA MARCA DEFINIDA RESTOS DE CABLE Y CAPILAR. ARMO Y BAJO BHA #35 CON ROTARY SHOE HASTA 2596 FT |
| TITAN-125 | RAYB-008 | EL RAYO-B008 | 10 | BAJANDO BHA #4 PARA BOMBEO MECÁNICO DESDE 3743 FT HASTA 5136,31 FT PROFUNDIDAD DE NIPLE DE ASENTAMIENTO + RETIRA SUBESTRUCTURA + DESARMA Y RETIRA CONJUNTO BOP + SLICK LINE UBICAN UNIDAD, ARMAN HERRAMIENTAS CON PULLING TOOL 2-7/8", BAJA A RECUPERAR STD. VALVE 2.25" NIPLE DE ASENTAMIENTO + CIA. ARLIFT REALIZA PRUEBA DE BOMBEO MECÁNICO Y HERMETICIDAD + BAJA VARILLA DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE BOMBEO MECÁNICO DE 3/4", 7/8" CON 146 VARILLAS @ 3650 FT |
| TRIBOILGAS-101 | SHSO-168 | SHUSHUFINDI-O168 | 05 | |
| TRIBOILGAS-102 | SHSF-191 | SHUSHUFINDI-F191 | 04 | CONT POOH BHA#2 MOLEDOR EN 3-1/2 DP QUEBRANDO, RSEG, DESARMA BHA#2, QUIEBRA KELLY, SUBE LLAVE HIDRÁULICA, ARMA SPOOLER Y MONTA CARRETO 1, RSEG, ARMA BES S8000N, SUBE POLEA, ACOPLA MLE Y CAPILARES, CONT ARMANDO BES S8000N, ARMA BHA DE PROD, BAJA EQ BES S8000N EN 3-1/2 TSH CR3 CALSE A TUBO A TUBO |
| TRIBOILGAS-103 | DRRC-052 | DRAGO NORTE-C052 | 04 | CONT RIH BHA #2 SEAL BORE PACKER, RSEG, MANIOBRA PARA ASENTAR SEAL BORE PKR, RECORRE Y CORTA CABLE DE PERFORACION, SACA BHA#2 SETTING TOOL SC-70 EN 3-1/2 DP QUEBRANDO, RSEG, DESARMA SETTING TOOL |
| TRIBOILGAS-105 | TTTA-021 | TETETE-A021 | 05 | ASIENTA RETENEDOR DE CEMENTO A 9140 FT + RIG UP EQUIPOS, LÍNEAS DE CEMENTACIÓN Y REALIZA PRUEBAS, OK + REALIZA PRUEBA DE ADMISIÓN, OK + PREPARA 10 BLS DE LECHADA DE CEMENTO PARA SQUEEZE Y REALIZA CEMENTACIÓN FORZADA A LAS ARENAS "Ts" Y "Ti" + SACA BHA #10 HASTA SUPERFICIE Y QUIEBRA SETTING TOOL + RDS + ARMA BHA #11 MOLEDOR CON 6-1/8" JUNK MILL PIRANHA MILL Y BAJA EN PARADAS DE TUBERÍA 3-1/2" DRILL PIPE HASTA 4000 FT |
| TRIBOILGAS-106 | SCHAF-519 | SACHA-AF519 | 03 | Retiran subestructura. Retiran BOP. Arman cabezal. Instalan líneas capilares 3/8" para inyección de químicos. Realizan prueba de rotacion. |

# SUMARIO DE OPERACIONES

## OPERACIONES CON TORRES: Nov/5/2026 06:00 am - Nov/6/2026 06:00 am

| TALADRO | POZO | NOMBRE POZO | No | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Realizan prueba de produccion. Finalizan operaciones. |
| TRIBOILGAS-107 | EDYB-161 | EDEN YUTURI-B161 | 04 | MOVILIZACIÓN DEL RIG TBG-107 DESDE EL POZO NNKB-001 HASTA EL POZO EDYB-161: EQUIPO: DESARMADO: 100%, EN POZO NNKB-001: 10%, EN PUERTO ZECH: 40%, EN PUERTO NUEVO: 30%, EN POZO EDYB-161: 20%. CAMPAMENTO: DESARMADO: 100%, EN PUERTO ZECH: 5%, EN POZO EDYB-161: 95%, ARMADO: 0% |
| TRIBOILGAS-201 | YNOA-005 | YANAQUINCHA OESTE-A005 | 07 | REALIZA TRASTEO DE PKNA-009 A YNOA-005. LEVANTA TORRE. INICIA OPERACIONES. S/L RECUPERA STD VALVE Y ABRE CAMISA. DESPRESURIZA POZO, OPERACION EN PROCESO Y PREPARA FLUIDO DE CONTROL |
| TRIBOILGAS-202 | SCHAQ-497 | SACHA-AQ497 | 03 | ABREN CAMISA DE CIRCULACIÓN, CONTROLAN POZO POR BATCHS, INSTALAN 3" BPV EN TUBING HANGER, RETIRAN CABEZAL DE PRODUCCIÓN MÁS LÍNEA DE PRODUCCIÓN (BAYONETA). |
| TRIBOILGAS-203 | SCH-089 | SACHA-089 | 06 | CONTINÚA BAJANDO COMPLETACIÓN DEFINITIVA EN TUBERÍA DE 3-1/2" EUE CLASE A, SUBIENDO TUBO A TUBO., REALIZA TRABAJOS DE SLICKLINE, ASIENTA COMPLETACIÓN & PRUEBA OK, DESARMA SUBESTRUCTURA, RAMPA & BOP, ARMA CABEZAL SLICKLINE ABRE CAMISA ARENA PRODUCTORA HS, BAJA STANDING VALVE 2.75", ABRE CAMISA DE CIRCULACIÓN, PRUEBA CIRCULACIÓN OK, DESARMA EQUIPOS. |
| TRIBOILGAS-204 | SCH-070 | SACHA-070 | 15 | BAJAN EQUIPO BES (DN1750-D1050N), DE CIA. SLB EN TUBERÍA 3 1/2" HSM-2 L80-1 1%CR PREMIUM (RE-RUN) EN PARADAS, DESDE 6120 FT HASTA 7547,76 FT FONDO DEL EQUIPO. INSTALAN TRES CENTRALIZADORES PARA CASING DE 7". REALIZAN CAMBIO DE CARRETO EN SPOOLER. TÉCNICOS DE CIA. SLB REALIZAN EMPALME DE CABLE DE POTENCIA # 2/1 ELB GG5F (2) WT 3/8 DEL SEGUNDO CARRETO AL TERCER CARRETO A 7547,76 FT, FONDO DEL EQUIPO BES. CONTINÚAN BAJANDO EQUIPO BES (DN1750-D1050N), DE CIA. SLB EN TUBERÍA 3 1/2" HSM-2 L80-1 1%CR PREMIUM (RE-RUN) EN PARADAS, DESDE 7547.76 FT HASTA 9287.18 FT FONDO DEL EQUIPO. INSTALAN TUBING HANGER 10-3/4" x 3-1/2" EUE x 5000 PSI, REALIZA PRUEBA DE PRESIÓN CON 2500 PSI X 10 MINUTOS. BAJAN POLEAS DE 60` Y 40` API DESDE LA TORRE. |
| TRIBOILGAS-206 | YNEA-028 | YANAQUINCHA ESTE-A028 | 04 | TRABAJAN SARTA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE TOPE DE PEZ DESDE 9858 FT HASTA 9859.5 FT (1.5 FT DE AVANCE) CON CIRCULACION EN REVERSA Y ROTACION, SE RECUPERAN RESTOS DE CHATARRA EN LA ZARANDA QUE GENERARON TAPONAMIENTO INTERNO EN VARIAS OCASIONES. |
| TUSCANY-104 | PYA-001 | PACAYACU-001 | 14 | CONT. MOVILIZANDO RIG TUSCANY-104 DESDE EL POZO PACAYACU-05 AL POZO PACAYACU-01, DISTANCIA 7.0 KM. LEVANTA TORRE. ARMA EQUIPO 100%. INICIA OPERACIONES CON EL RIG TUSCANY-104 EN EL POZO PYA-001 WO#14 EL 05-NOV-2026 A LAS 12:00 HRS. DESPRESURIZA POZO. PREPARA FLUIDO Y CONTROLA POZO CON FLUIDO DE CONTROL ESPECIAL 8.34 PPG DE CÍA. SLB, TOTAL 330 BBL BOMBEADOS, MONITOREA POZO ESTÁTICO, OK. RETIRA CABEZAL. INSTALA Y PRUEBA BOP. SUBE POLEA. SACA EQUIPO BES WD1000MF DE CÍA. ALKHORAYEF EN TUBING 3-1/2" TSH BLUE TUBO X TUBO, FUERA DEL POZO 558 FT. |
| TUSCANY-105 | SHSB-151 | SHUSHUFINDI-B151 | 12 | |
| VICTORIA 01 | SCHR-170 | SACHA-R170 | 12 | DESARMA BHA DE ESTIMULACIÓN, ARMA Y BAJA NUEVA |

# SUMARIO DE OPERACIONES

## OPERACIONES CON TORRES: Nov/5/2026 06:00 am - Nov/6/2026 06:00 am

| TALADRO | POZO | NOMBRE POZO | No | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | COMPLETACIÓN SELECTIVA EN TUBERÍA DE 3-1/2" EUE EN PARADAS HASTA +/- 9671 FT, INSTALA HGR, REALIZA CORRIDAS DE SLICKLINE, RECUPERA STANDING VALVE 2.75", BAJA A CERRAR CAMISA @ 9636 FT. |
| VICTORIA 03 | EDYL-014I | EDEN YUTURI-L014I | 04 | BAJA BHA # 12 COMPLETACIÓN DE INYECCIÓN DE CIA SLB EN 3-1/2" DS-38 D.P, TÉCNICO DE CIA SLB REALIZA TRABAJOS DE ASENTAMIENTO 7" QUANTUM PACKER ASSY. |
| VICTORIA 04 | SCH-085 | SACHA-085 | 13 | CIERRAN 3 1 /2" X 2.31" CAMISA @ 9538.32'. PRESURIZAN CON 3000 PSI Y ASIENTAN 2 PACKER HIDRÁULICOS MODELO SFHL + PRUEBAN HERMETICIDAD CON 700 PSI OK. DESARMAN BOP Y ADAPTER. ARMAN CABEZAL HIDRÁULICO Y PRUEBAN CON 3000 PSI. ABREN 3 1/2" X 2.31" CAMISA @ 9538.32' Y REALIZAN PRUEBA DE ADMISIÓN. ASIENTAN 2.75" STANDING VALVE. ABREN 3 1/2" X 2.81" CAMISA DE CIRCULACIÓN @ 9264.90'. SUSPENDEN OPERACIONES. |
| VICTORIA 05 | SCHV-214 | SACHA-V214 | 10 | Continúa moliendo cabeza de completación de fondo (pescado) hasta 9964 ft. Circula pozo en reversa. Desconecta Kelly Swivel. Saca BHA #10 moledor con 6" junk mill de Cía. WIS, en paradas de 3-1/2' drill pipe @ 7725 ft (operación en proceso). |
| VICTORIA 06 | SCHAO-610 | SACHA-AO610 | 03 | CONTINUA BAJANDO BHA #06 DE LIMPIEZA EN TANDEM DE 7" Y 9-5/8'' CON 6-1/8'' JUNK MILL DE CIA DYNADRILL EN 3-1/2'' DS-38 DRILPIPE 13.3 LBS/FT HASTA 12596 FT. CIRCULA EN FONDO 2 CAPACIDADES. SACA BHA #06 DE LIMPIEZA DESDE 12596 FT HASTA 5079.24 FT. |
| | OSOG-065 | OSO-G065 | 02 | ARMA BHA DE LIMPIEZA EN TÁNDEM. BAJA BHA DE LIMPIEZA EN TÁNDEM CON TUBERÍA 3-1/2" DRILL PIPE DESDE 2152 PIES HASTA 9146 PIES, BAJANDO TUBO POR TUBO (18 PIES ARRIBA DE PROFUNDIDAD A ALCANZAR). TRABAJA SARTA CON ROTACIÓN Y PESO PARA INTENTAR AVANZAR; EN PROCESO. |

* Pozos con eventos abierto

No hay datos disponibles
