SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Dec/6/2022 06:00 am - Dec/7/2022 06:00 am

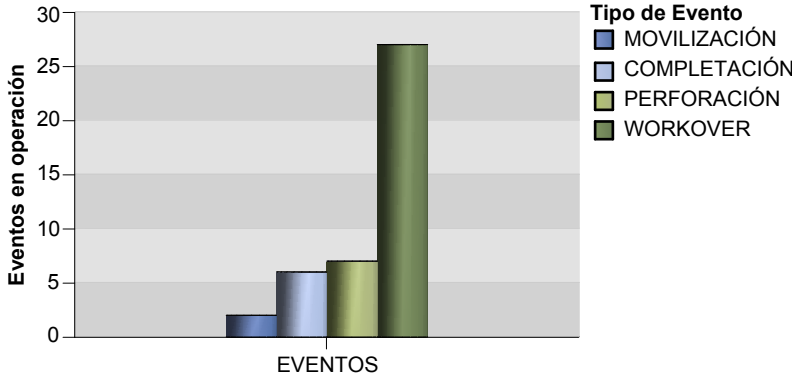

EN PERFORACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	MD	TVD	DETALLE
SINOPEC 127	PYMG-037	PAYAMINO-G037	5,124	4,548.71	PERFORA HASTA 3537 FT. CIRCULA. BOMBEA PILDORAS DISPERSAS Y VISCOSAS EN TANDEM. PERFORA CON BHA DIRECCIONAL #3 Y BROCA PDC DE 16" HASTA 5124 FT
PETREX 5824	LGAJ-061H	LAGO AGRIO-J061	10,983.52	10,423.54	CONT. DENSIFICANDO FLUIDO @ 10.8 ppg PARA INGRESO A BASAL TENA + CONT. PERFORANDO SECCION DE 8-1/2" CON BHA DIR. CON BROCA PDC + ICRUISE + HTAS. M/ LWD (BHA #4) DESDE 9,308 ft HASTA 10,143 ft MD + CIRCULA HOYO + SACA BHA DIR. DE 8-1/2" @ XXXX ft MD
SLR-402	SHSO-103	SHUSHUFINDI-O103	6,292	5,913.26	PERFORÓ SECCION DE 12 1/4" HASTA 6,292' PT. CSG, CIRCULÓ Y SACÓ HASTA 5,430' (SOBRE ORTEGUAZA) CIRCULÓ TREN DE PILDORAS SACÓ BHA #2 HASTA SUPERFICIE.
CCDC-028	ISHB-059	ISHPINGO-B059	6,284.35	6,277.46	PERFORA SECCIÓN DE 8 1/2" CON BHA DIRECCIONAL #3 HASTA 5630 FT (PT) + BOMBEA PILDORAS DE LIMPIEZA Y REALIZA VIAJE DE CALIBRACIÓN AL ZAPATO DE 9 5/8" + RETORNA A FONDO + BOMBEA PILDORAS Y CIRCULA + SACA Y QUIEBRA BHA#3 EN SUPERFICIE + WIRELINE ARMA HTAS
CCDC-066	ISHA-021	ISHPINGO-A021	7,875	5,664.05	BAJA LINER 7" CON COLGADOR TIW XPAK EN PARADAS DP 5-1/2" A 7873', CIRCULA, CEMENTA LINER 7" SEGUN PROGRAMA, EXPANDE COLGADOR Y LIBERA SETTING TOOL, CIRCULA PARA RETORNO DE ESPACIADOR, CAMBIA LODO POR AGUA FRESCA, SACA Y QUIEBRA SETTING TOOL EN SUPERFICIE
SINOPEC 168	YRCE-028	YURALPA CENTRO-E028	8,287	8,287	REALIZÓ DRILL OUT DE CEMENTO PERFORÓ SECCIÓN DE 8 1/2" CON BHA #04 DIRECCIONAL CON MOTOR MÁS BROCA PDC, MÁS SACO A SUPERFICIE Y QUIEBRA BHA #04 DIRECCIONAL MAS BAJA LINER DE 7" ARMA EQUIPO DE FLOTACIÓN DE 7" Y REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL MISMO OK
SINOPEC 248	SCHA-417	SACHA-A417	10,576	10,052.09	SACA BHA #6 (PDC+LWD) A SUPERFICIE Y QUIEBRA, ARMA HERRAMIENTAS PARA COLGADOR DE LINER, CORRE LINER 7", CONECTA COLGADOR, BAJA LINER DE 7" + COLGADOR VERSAFLEX HASTA 9925 FT.

EN COMPLETACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
CCDC-036	TPTCP-097I	TIPUTINI-CP097I	COM	INSTALA Y ARMA POLEAS DE REGISTRO + BAJA CONJUNTO TCP

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Dec/6/2022 06:00 am - Dec/7/2022 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
				CON CAÑONES DE 4-1/2"@12 DPP DESDE SUPERFICIE HASTA 9620 FT + ARMA Y BAJA HRRTAS DE CORRELACIÓN + INTENTA CONTINUAR BAJANDO SIN EXITO+BAJA HRRTA+UBICA MARCA+CORRELACIONA
SINOPEC 156	ACAH-270H	AUCA-H270H	COM	Arman completacion para seccion horizontal open hole con liner ranurado de 4-1/2" y blank pipe de 4-1/2" con inner string de 2-7/8" STL. Bajan completacion para seccion horizontal open hole en 5-1/2" drill pipe en paradas
SINOPEC 185	ISHB-041	ISHPINGO-B041	COM	SACA Y QUIEBRA RETREIVING TOOL CON QUANTUM PACKER + ARMA Y BAJA BHA DE LIMPIEZA PARA CSG 9 5/8" HASTA TOL A 5287' Y CIRCULA + SACA Y QUIEBRA BHA DE LIMPIEZA + ARMA Y BAJA BHA DE LIMPIEZA PARA LINER DE 7" HASTA LANDING COLLAR A 6710 FT
SLR-401	ACAO-286	AUCA-O286	COM	BAJA BHA DE @ 10434 FT, ASIENTA PACKER HD @ 10365 FT. PRUEBA HERMETICIDAD EN DIRECTA CON 2000 PSY Y ANULAR CON 800 PSI, OK. ABRE CAMISA @ 10293 FT. REALIZA CAMBIO DE FLUIDO. BAJAR BOMBA JET 12K. EVALUACIÓN DE ARENA U INFERIOR CON BOMBA JET REVERSA 12K
TUSCANY 104	SCYC-053	SECOYA-C053	COM	
TUSCANY 111	ACAL-249	AUCA-L249	COM	CORTA CABLE DE PERFORACION. ARMA Y CUELGA KELLY. LLENAN POZO CON 7.3 BLS, PRUEBAN CON 2000 PSI. ARMAN BHA#1 DE MOLIENDA CON BROCA TRICONICA DE 6-1/8".

EN MOVILIZACIÓN

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
SINOPEC 183	CLBC-055	CULEBRA-C055	MOV	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TOP DRIVE. REALIZO CAMBIO DE VALVULA HIDRAULICA Y SHUT DOWN DEL EQUIPO DE PERFORACION
SINOPEC 191	SCHAQ-490	SACHA-AQ490	MOV	EMBARCA Y ENVÍA 18 CARGAS: 5 GENERADORES, 4 CASH TANK, 1 SCR, CANASTA DE HERRAMIENTAS, ACUMULADOR, TOP DRIVE, RIELES, 3.5 in TUBING, PANELES ELÉCTRICOS, UNIDAD DE WATERING, ESTRUCTURA DE BODEGA DE QUÍMICOS. RIG DOWN = 100%, RIG MOVE = 82%, RIG UP = 75%

EN WORKOVER

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
CCDC-042	PLAA-030	PALO AZUL-A030	10	CONITNUA BAJANDO EQUIPO BES HALL SF320 EN TUBERIA 3 1/2" EUE EN PARADAS HASTA 9885' (INTAKE), 9925' (PUNTA). INSTALA HANGER Y PRUEBA, REALIZA LOWER PIG TAIL. DESARMA BOP. ARMA CABEZAL DE PRODUCCION Y PRUEBA CON PRESION. REALIZA PRUEBA DE ROTACION BES.
DYGOIL-20	SNSB-022	SANSAHUARI-B022	02	CONTINÚA MOLIENDO CEMENTO CON BHA DE MOLIENDA + BROCA RAPTOR DE 6-1/8" DESDE 8529 FT HASTA 8570 FT, PRUEBA "U" SUP., CONTINÚA MOLIENDO HASTA 8632 FT, PRUEBA "U" INF. CONTINÚA MOLIENDO CEMENTO Y CIBP HASTA 8680 FT, BAJA HASTA 8868 FT, CAMBIA FLUIDO.
DYGOIL-30	DRRA-011	DRAGO NORTE-A011	07	BAJA POLEA + DESARMA EQUIPO BES SF900 + SLICKLINE BAJA BLOQUE IMPRESOR DE 5-3/4" Y 4-1/2" HASTA 9874 FT + ARMA Y BAJA BHA DE LIMPIEZA EN TANDEM EN TUBERIA 3-1/2" EUE HASTA 9833.76 FT + SACA BHA DE LIMPIEZA EN TUBERIA 3-1/2" EUE.
FASTDRILLING-11	VHRH-004	VICTOR HUGO RUALES-H004	05	BAJA BHA#03 DE PESCA + REALIZA MANIOBRAS A 7296 FT (PESCADO). SACA QUEBRANDO D.P. DE 3-1/2" HACIA LOS CABALLETES. DESARMA BHA#3 CON PESCADO (SENSOR +

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Dec/6/2022 06:00 am - Dec/7/2022 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
				CENTRALIZADOR + PARTE DE COMPLETACIÓN DE FONDO CON 2 PKRS). ARMA BHA#4 DE PESCA CON OVERSHOT Y GRAPA.
GEOPETSA-05	PCN-024	PUCUNA-024	01	CONTINUÓ SACANDO BHA CON CAMPANA ON-OFF EN 3 1/2" EUE EN PARADAS. CAMBIÓ NIPPLE A DISPARO. R/U WIRELINE, RIH & SET EZDRILL/CIBP @ 10630'. BAJANDO TUBING 3 1/2" EUE PUNTA LIBRE CON NO-GO & SV 2.75".
HILONG 28	AGRD-030	AGUARICO-D030	05	BAJA EQUIPO BES S8000N HASTA 3389 FT, CAMBIA DE CARRETO#1 A CARRETO#2, REALIZA EMPALME DE CABLE, CONTINUA BAJANDO EQUIPO BES HASTA 6600 FT, CAMBIA DE CARRETO #2 A CARRETO #3
ORD-902	SHSN-224	SHUSHUFINDI-N224	09	BAJA BHA#1 DE LIMPIEZA LINER DE 7" CON 6-1/8" BROCA PLANA TRABAJA SARTA TOPE DEL LINER BAJA HASTA 10470' FONDO ALCANZADO, SACA BHA#1 DE LIMPIEZA PARA LINER DE 7" CON 6-1/8" BROCA PLANA EN DRILL PIPE 3-1/2" IFQUEBRANDO TUBO A TUBO
ORD-903	ACAE-206	AUCA-E206	01	RELIZAN PRUEBAS AL TAPON 7" SIMPLUS NO SATISFACTORIAS, SACAN BHA A SUPERFICIE, RETIRAN 7" TAPON SIMPLUS.
SINOPEC 932	ACSB-017	AUCA SUR-B017	05	REALIZA MINI MOVE DESDE EL POZO ACSB-019 HASTA EL POZO ACSB-017 (DISTANCIA 12 MTS). LEVANTA TORRE. DESCONECTA Y RETIRA CONECTOR DE SUPERFICIE. SLK ABRE CAMISA DE CIRCULACIÓN. REALIZA PRUEBA Y RETIRA SECCIÓN C DEL CABEZAL.
SINOPEC-903	SHSH-201	SHUSHUFINDI-H201	04	REALIZAN LIMPIEZA A LOS COMPONENTES DEL RIG PARA CERTIFICACION. BAJAN TORRE.
SINOPEC-905	LMNH-033	LIMONCOCHA-H033	04	SACA BHA # 1 MOLEDOR A SUPERFICIE, DESARMA, S/LINE BAJA BLOQUE IMPRESOR HASTA 9711 FT, ARMA BHA # 2 MOLEDOR, BAJA EN 3.5 DP HASTA 9716 FT.
TRIBOILGAS-101	SCH-031	SACHA-031	18	DESARMA BHA DE LIMPIEZA + ARMA PRIMERA PARTE DE EQUIPO BES + INSTALA CAPILAR + SUBE POLEA + ARMA SEGUNDA PARTE DE EQUIOP BES + ARMA BHA DE PRODUCCION + MEGADA INICIAL + BAJA EQUIPO BES HASTA 4280 FT + CAMBIO DE CARRETO.
TRIBOILGAS-103	SCHAP-481	SACHA-AP481	04	DESARMA EQUIPO BES FLEX 3.2 DE CIA. BAKER. CORRE BLOQUE IMPRESOR DE 4 1/2", ENCUETRA OBSTRUCCION @ 8400 FT. ARMA Y BAJA BHA DE LIMPIEZA DEL RIG HASTA 10557 FT. SACANDO BHA DE LIMPIEZA DE 7" DEL RIG EN 3 1/2" EUE TUBERIA QUEBRANDO TUBO POR TUBO @ 3500 FT
TRIBOILGAS-104	OSOD-009	OSO-D009	05	SLICK LINE CIA. DYGOIL BAJA BLOQUE IMPRESOR Y DETERMINA TOPE DE FLUIDO @ 4125'. ARMA EQUIPO BES (FLEX-7ER / 270 STG) DE CIA. BAKER. ARMA BHA DE PRODUCCION SOBRE BES. BAJA EQUIPO BES EN PRDS TBG 3-1/2" EUE COND 2 HASTA 3923.46'.
TRIBOILGAS-105	GNTE-004	GUANTA-E004	18	RETIRÓ BOP, INSTALÓ CABEZAL, REALIZÓ CONEXIÓN DE CONECTOR UPPER, BAJÓ TORRE, REALIZÓ PRUEBA DE ROTACIÓN Y PRODUCCIÓN ARENA BASAL TENA CON EQUIPO BES WD4500
TRIBOILGAS-106	PCCB-030	PANACOCHA-B030	01	SACAN Y QUIEBRAN BHA DE FRACTURA. BAJAN BLOQUE IMPRESOR DE 5-3/4". ARMAN EQUIPO BES.
TRIBOILGAS-107	ISHA-006H	ISHPINGO-A006H	02	CONT. ARMANDO SUBESTRUCTURA. LEVANTA SARTA. CUELGA POLEA. SACA EQUIPO BES H8500. DESARMA BHA DE PRODUCCIÓN Y EQUIPO BES. ARMA Y BAJA 2-7/8" EUE TAPON CON 2-7/8" EUE PUP JOINT CORTO PERFORADO EN 2-7/8" EUE TUBERÍA.
TRIBOILGAS-201	PKSA-003	PAKA SUR-A003	05	OPERACIONES DE MOLIENDA, SE MUELE 1 CIBP ASENTADO @ 9560 FT, 1 RETENDOR DE CEMENTO ASENTADO @ 9600 FT , 1 1

SUMARIO DE OPERACIONES

OPERACIONES CON TORRES: Dec/6/2022 06:00 am - Dec/7/2022 06:00 am

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	No	DETALLE
				RETENDOR DE CEMENTO ASENTADO @ 9790 FT. + SE AVANZA HASTA 9807 FT DONDE ESNCUENTRA RESTRICCION
TRIBOILGAS-203	SCHAI-414	SACHA-AI414	07	ASIENTAN PACKER MECÁNICO HD DE 7" X 2-7/8" @ 9835 FT +/- 5 FT., LLENAN ANULAR CON 330 BLS DE FCE., PRUEBAN ASENTAMIENTO DE PACKER CON 1500 PSI/5min., CIA. SLB REALIZA RIG UP DE SET DE FRACTURA., PREPARAN 14 BLS DE ÁCIDO ACÉTICO AL 10 %
TRIBOILGAS-204	SCHQ-469	SACHA-Q469	03	BAJA BLOQUE IMPRESOR DE 4 1/2". ARMA EQUIPO BES FLEX7ER. SUBE POLEA. ARMA BHA DE CIRCULACIÓN. BAJA EQUIPO BES FLEX7ER EN 3 1/2" TUBING TSH-BLUE TORQUEANDO CON LLAVE HIDRAULICA COMPUTARIZADA HASTA 4548.87' (CENTRALIZADO. CAMBIA CARRETO. REALIZANDO EMPALME.
TUSCANY-105	ACAR-131I	AUCA-R131I	01	DESARMÓ NB(1100-1800)H DE CÍA. NOVOMET. REALIZO ECHOMETER, NIVEL A 8936 FT. SLK BAJÓ BLOQUE IMPRESOR 5-3/4" HASTA 11787 FT (COTD @ 11822 FT). REUBICÓ SPOOLER Y SUBIÓ SISTEMA COMPUTARIZADO DE MISSION. ARMÓ EQUIPO BES NAV(190-380)H.
VICTORIA 01	YRCF-007	YURALPA CENTRO-F007	05	UBICA UNIDAD DE BOMBEO Y ARMA LINEAS DE INYECCION Y RETORNO DE CIA. SLB, PRUEBA LINEAS DE INYECCION Y ANULAR OK, PRESURIZA ANULAR CON 500 PSI,
	LMNJ-010	LIMONCOCHA-J010	10	

* Pozos con eventos abierto

TALADRO	POZO	NOMBRE POZO	EVENTOS	ÚLTIMO REPORTE
GEOPETSA-03	LGA-034	LAGO AGRIO-034	MOVILIZACIÓN	12/6/22
